


«1С:PM Управление проектами ПРОФ», обзор функциональных возможностей новой редакции 5.0




Линейка решений «1С:PM Управление проектами»



«1С:PM Управление проектами КОРП»
«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP»
- для ERP.УХ/Корпорации
для корпораций и холдингов



«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP»
для средних и крупных организаций, в т.ч. выполняющих ГОЗ



«1С:УНФ+PM
Управление проектной фирмой»
для малых предприятий



«1С:PM
Управление проектами ПРОФ»
для МСП и проектных подразделений



Разработчик
ITLand



Совместные продукты
«1С» и ITLand



В прайс-листе
фирмы «1С»



Включены в реестр
российского ПО



Отрасли, в которых используется линейка решений «1С:PM Управление проектами»



НИПИ



Инжиниринг



Инвестиции



Девелопмент



Машиностроение, КБ



IT, консалтинг




Медиа



Проектный офис

«1С:PM Управление проектами ПРОФ», новая редакция 5

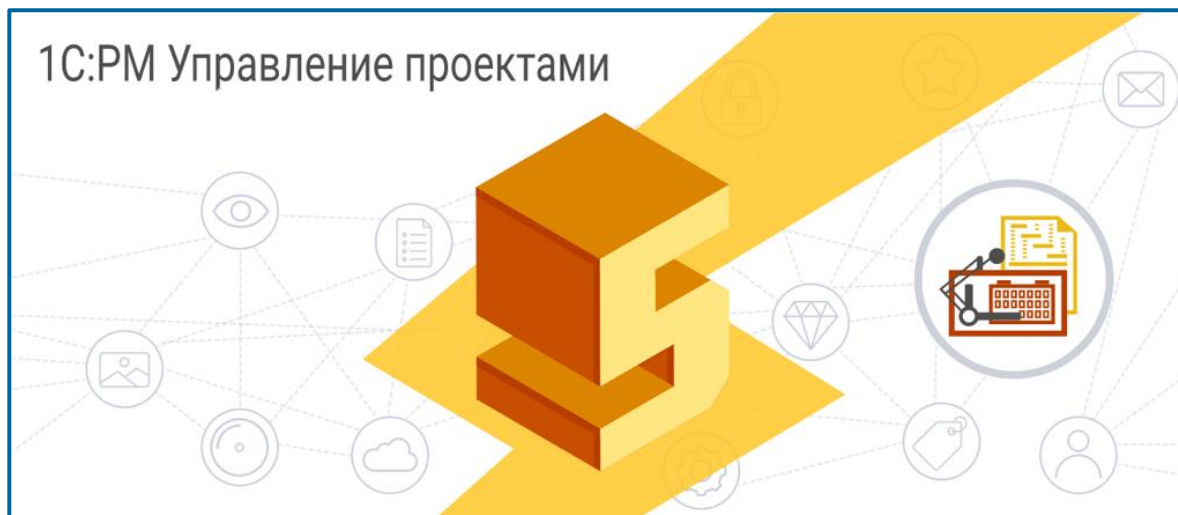


«1С:PM Управление проектами ПРОФ», редакция 5






Управление структурой проекта

«1С:PM Управление проектами», редакция 5

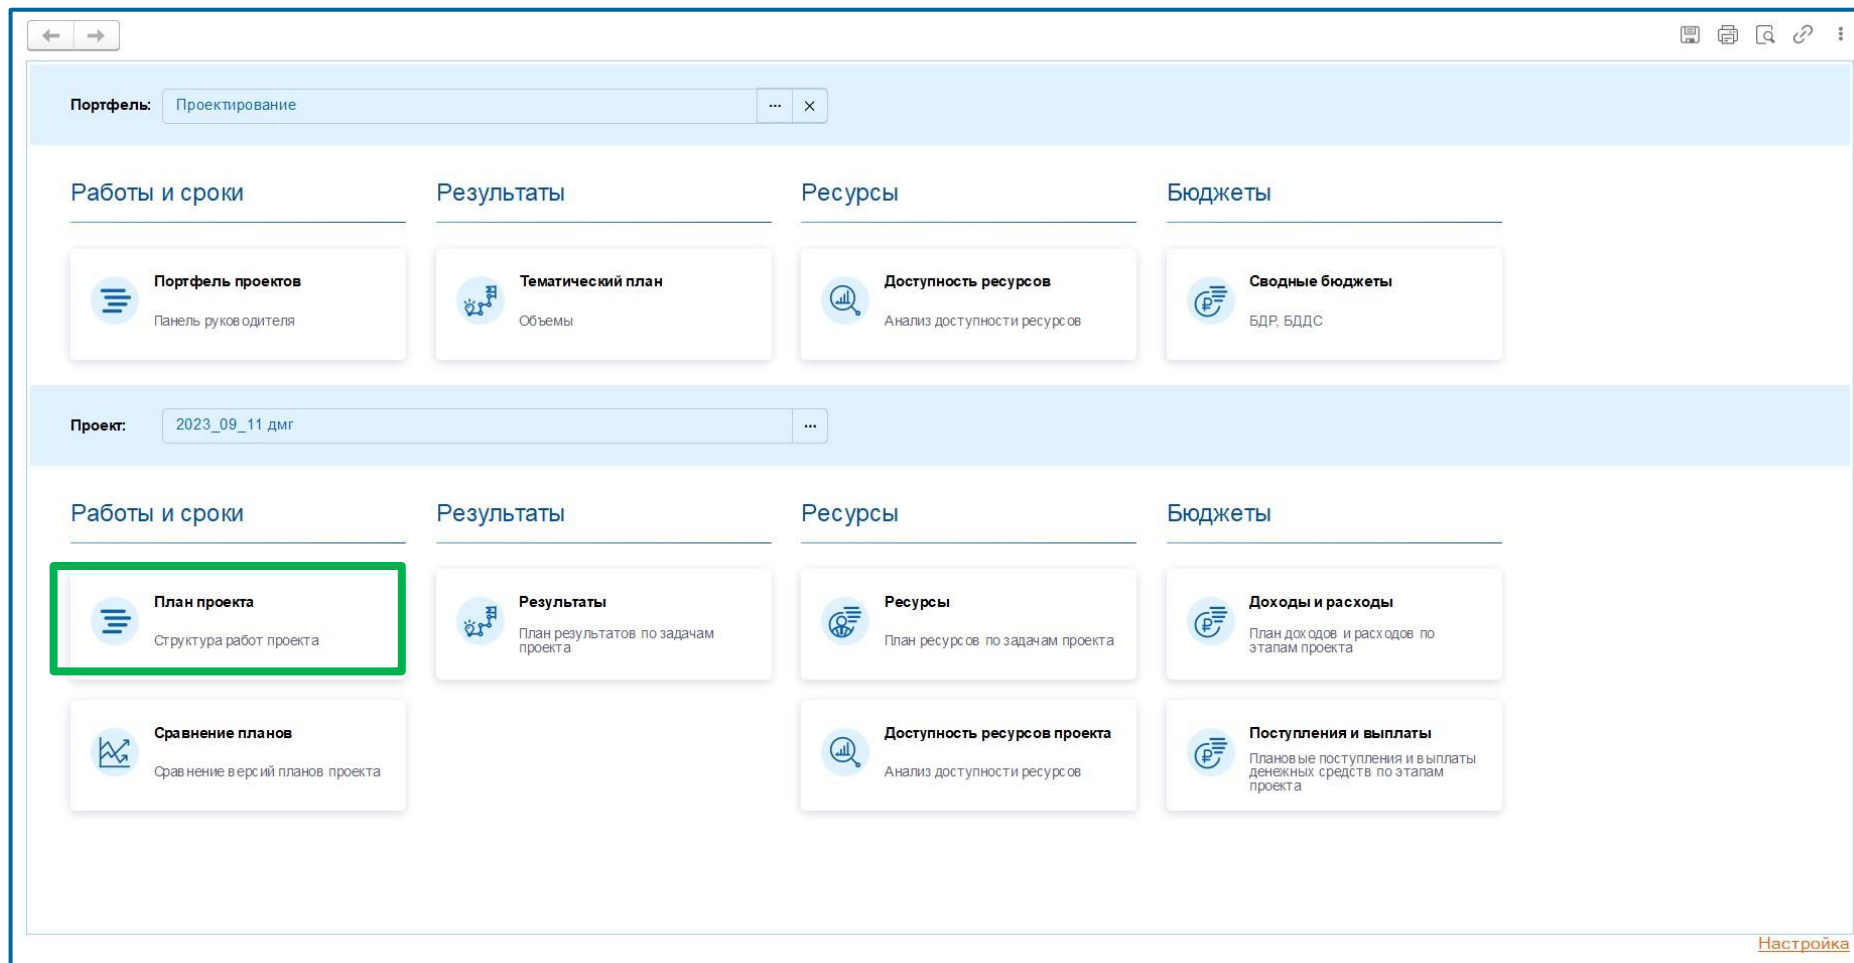

Редактирование структуры проекта в редакторе планов

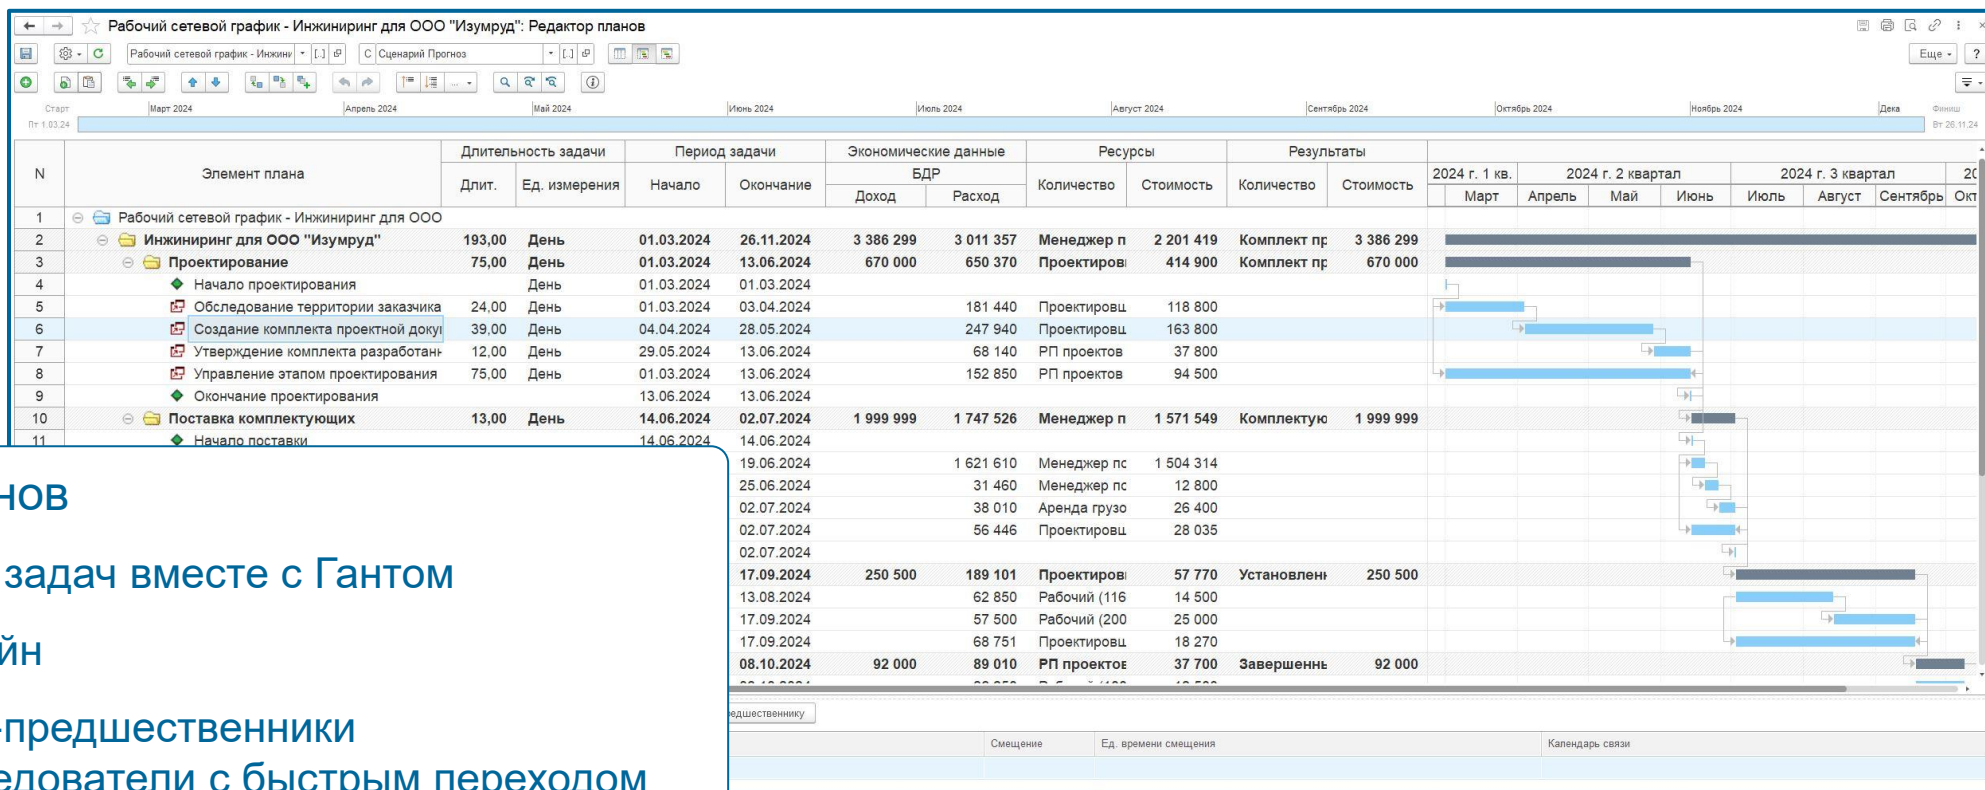

Редактор планов

- Дерево задач вместе с Гантом
- Таймлайн
- Задачи-предшественники и -последователи с быстрым переходом
- Панель свойств задачи
- Произвольный набор статусов для задачи
- Шкала статусов готовности

Редактирование структуры проекта в редакторе планов

Инвестиционный проект: Редактор планов

Инвестиционный проект [-] С Сценарий Прогноз

Старт: 2023 2024 2025 2026 2027 Финиш: Вт 14.09.27


N	Элемент плана	Длительность задачи		Период задачи		Ресурсы		Результаты		Экономические данные		2023 г.
		Длит.	Ед. измерения	Начало	Окончание	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Доход	Расход	
1	Инвестиционный проект, Прогноз											
2	Инвестиционный проект	1 718,00	День	01.01.2023	14.09.2027	Инженер (6 168,00); Пр	2 481 120	Помещения		7 896 000	7 304 120	
3	Инвестиционная фаза	1 060,00	День	01.01.2023	25.11.2025	Инженер (6 168,00); Пр	2 481 120				7 304 120	
4	Замысел проекта, маркетинг	65,00	День	01.01.2023	06.03.2023	Проектировщик (520,00)	163 800				337 800	
5	Бизнес-планирование, инженерные сети и оборудование	88,00	День	07.03.2023	02.06.2023	Проектировщик (704,00)	221 760				381 760	
6	Выделение земельного участка	108,00	День	03.06.2023	18.09.2023	Проектировщик (864,00)	272 160				1 772 160	
7	Разработка проекта	131,00	День	19.09.2023	27.01.2024	Проектировщик (1 048,00)	330 120				495 120	
8	Согласование и экспертиза	64,00	День	28.01.2024	31.03.2024	Проектировщик (512,00)	161 280				461 280	
9	Выбор подрядчиков и заключение договоров	88,00	День	01.04.2024	27.06.2024	Проектировщик (704,00)	221 760				321 760	
10	Подготовка строительной документации	42,00	День	28.06.2024	08.08.2024	Инженер (336,00)	60 480				324 480	
11	Нулевой цикл	63,00	День	09.08.2024	10.10.2024	Инженер (504,00)	90 720				250 720	
12	Надземная часть здания	196,00	День	11.10.2024	24.04.2025	Инженер (1 568,00)	282 240				507 240	
13	Инженерные сети и оборудование	151,00	День	25.04.2025	22.09.2025	Инженер (1 208,00)	217 440				792 440	
14	Отделочные работы	128,00	День	25.04.2025	30.08.2025	Инженер (1 024,00)	184 320				434 320	
15	Наружные инженерные сети	64,00	День	23.09.2025	25.11.2025	Инженер (512,00)	92 160				617 160	
16	Благоустройство территории	43,00	День	25.04.2025	06.06.2025	Инженер (344,00)	61 920				186 920	
17	Сдача объектов в эксплуатацию	42,00	День	15.10.2025	25.11.2025	Инженер (336,00)	60 480				310 480	

Применить Предшеств. Послед. Внеш. предшеств. Внеш. послед. Задачи ниже уровнем Добавить К предшественнику

N	Наименование	Тип связи	Смещение	Ед. времени смещения	Календарь связи
4	Замысел проекта, маркетинг	Окончание - Начало			

План проекта — это совокупность структурной декомпозиции работ, календарных сроков, контрольных событий и данных о привлекаемых трудовых, материальных и финансовых ресурсах, объемах и бюджетах

Расчет сроков

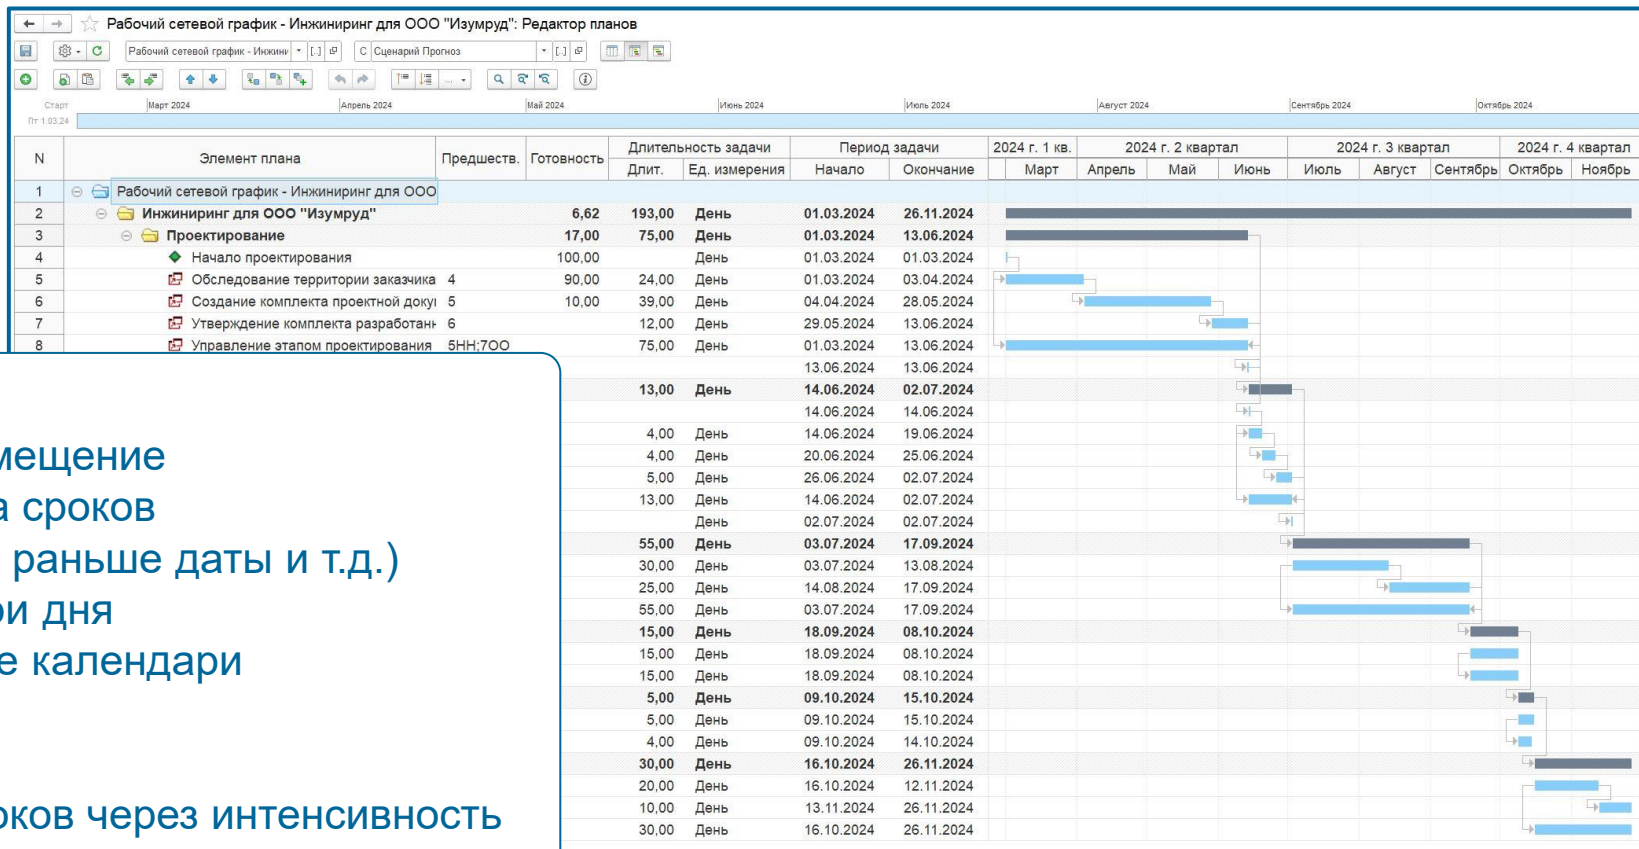


Расчет сроков

- Все виды связей и смещение
- Ограничения расчета сроков (как можно позже, не раньше даты и т.д.)
- Рабочее время внутри дня
- Базовые и зависимые календари
- Календари ресурсов
- Гамак
- Связь ресурсов и сроков через интенсивность
- Оперативный/неоперативный расчет сроков
- Связи между проектами и одновременное редактирование нескольких планов



Управление ресурсами

«1С:PM Управление проектами», редакция 5

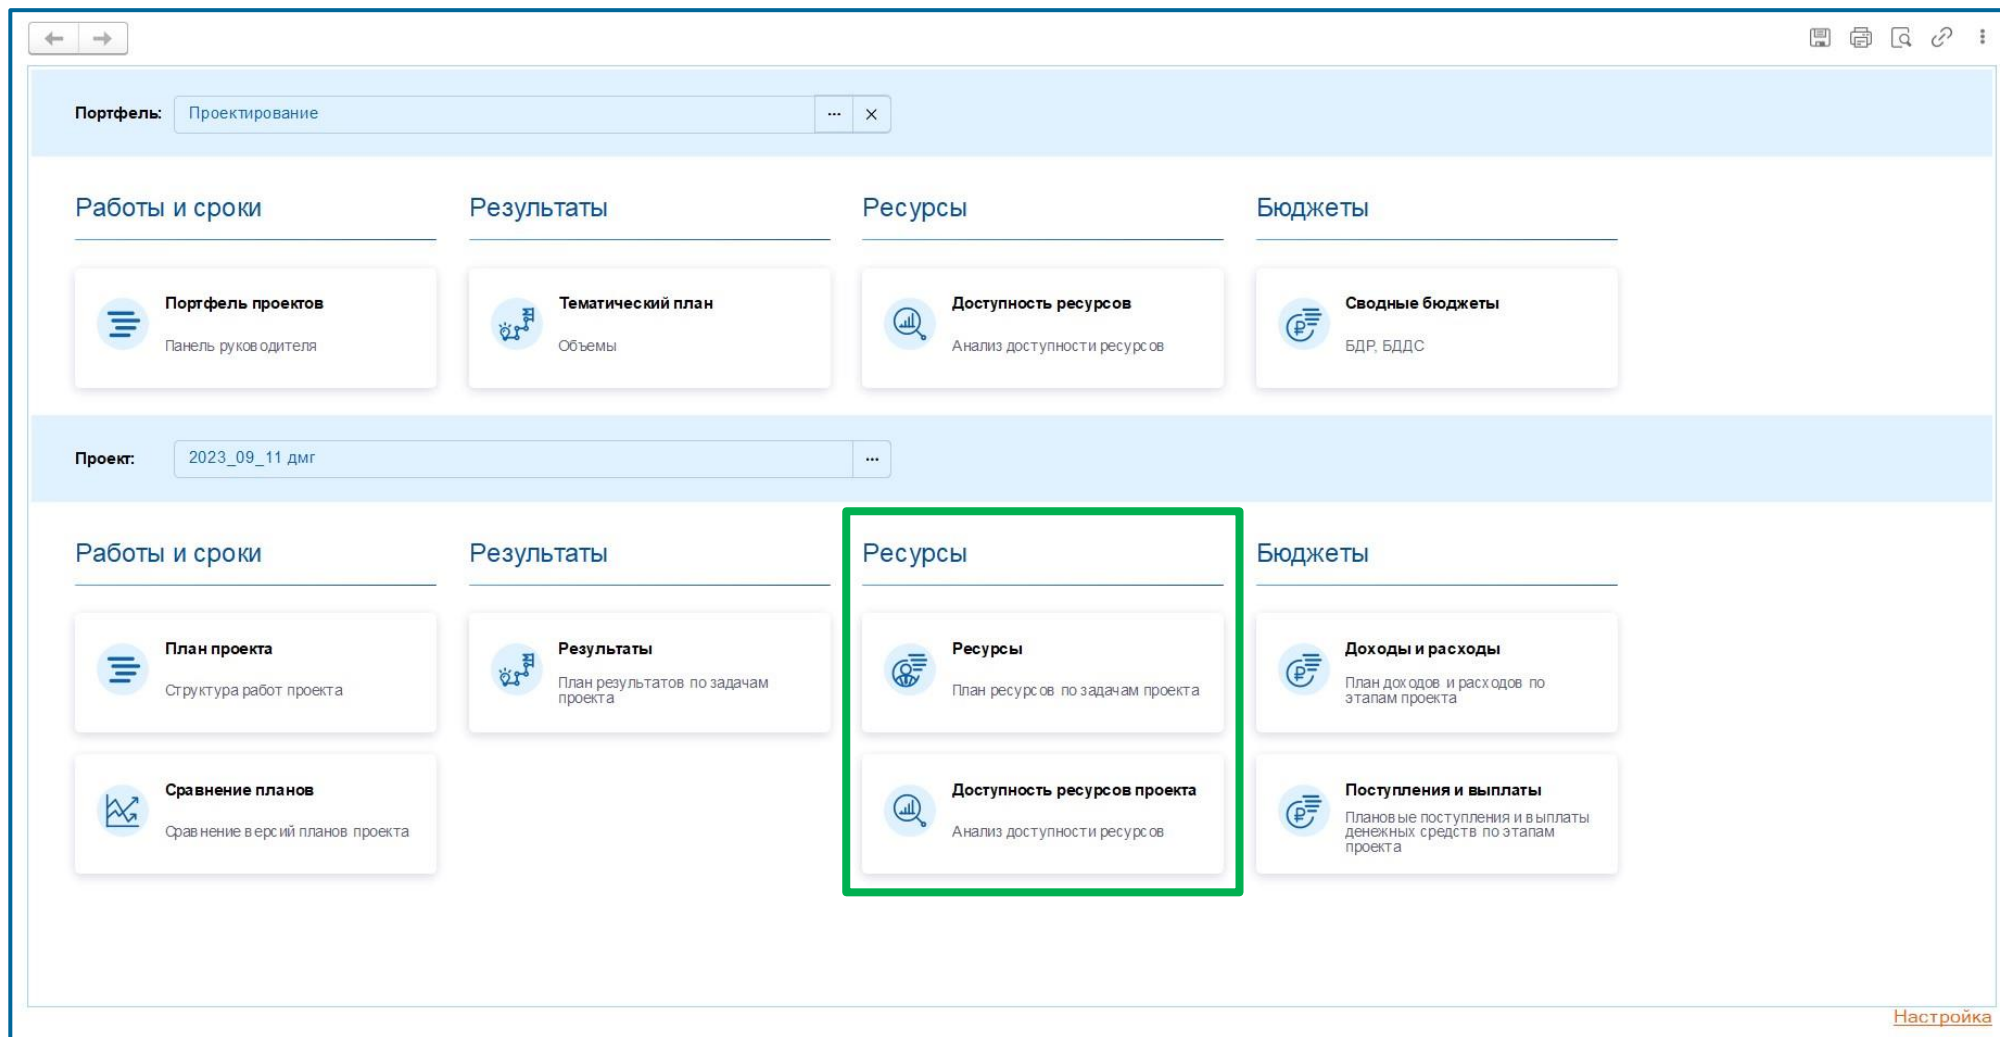

Ресурсы проекта в структуре проекта

Рабочий сетевой график - Инжиниринг для ООО "Изумруд": Редактор планов												
Старт: Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024												
N	Элемент плана	Длительность задачи		Период задачи		Ресурсы		Результаты		Экономические данные		2024 г. 1 кв. Март
		Длит.	Ед. измерения	Начало	Окончание	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Доход	Расход	
1	Рабочий сетевой график - Инжиниринг для ООО "Изумруд"	193,00	День	01.03.2024	26.11.2024	Менеджер п	2 201 419	Комплект пр	3 386 299	3 386 299	3 011 357	
2	Инжиниринг для ООО "Изумруд"	75,00	День	01.03.2024	13.06.2024	Проектиров	414 900	Комплект пр	670 000	670 000	650 370	
3	Проектирование											
4	Начало проектирования		День	01.03.2024	01.03.2024							
5	Обследование территории заказчика	24,00	День	01.03.2024	03.04.2024	Проектировщ	118 800				181 440	
6	Создание комплекта проектной докум	39,00	День	04.04.2024	28.05.2024	Проектировщ	163 800				247 940	
7	Утверждение комплекта разработанн	12,00	День	29.05.2024	13.06.2024	РП проектов	37 800				68 140	
8	Управление этапом проектирования	75,00	День	01.03.2024	13.06.2024	РП проектов	94 500				152 850	
9	Окончание проектирования			13.06.2024	13.06.2024							
10	Поставка комплектующих	13,00	День	14.06.2024	02.07.2024	Менеджер п	1 571 549	Комплектую	1 999 999	1 999 999	1 747 526	
11	Начало поставки			14.06.2024	14.06.2024							
				4.06.2024	19.06.2024	Менеджер по	1 504 314				1 621 610	
				20.06.2024	25.06.2024	Менеджер по	12 800				31 460	
				26.06.2024	02.07.2024	Аренда грузов	26 400				38 010	
				4.06.2024	02.07.2024	Проектировщ	28 035				56 446	
				02.07.2024	02.07.2024							
				03.07.2024	17.09.2024	Проектиров	57 770	Установленн	250 500	250 500	189 101	
				03.07.2024	13.08.2024	Рабочий (116	14 500				62 850	
				4.08.2024	17.09.2024	Рабочий (200	25 000				57 500	
				03.07.2024	17.09.2024	Проектировщ	18 270				68 751	
				08.09.2024	08.10.2024	РП проектов	37 700	Завершеннь	92 000	92 000	89 010	
				08.09.2024	08.10.2024	Рабочий (100	12 500				26 250	
				08.09.2024	08.10.2024	РП проектов	25 200				62 760	
				09.10.2024	15.10.2024	РП проектов	45 000	Объект при-	175 000	175 000	158 500	
				09.10.2024	15.10.2024	Проектировщ	19 800				40 740	
				09.10.2024	14.10.2024	РП проектов	25 200				117 760	
				06.10.2024	26.11.2024	Рабочий (200	74 500	Обучение (у	198 800	198 800	176 850	
				06.10.2024	12.11.2024	Рабочий (200	25 000				67 500	
				03.11.2024	26.11.2024	Тренер (180)	43 200				81 160	
				06.10.2024	26.11.2024	РП проектов	6 300				28 190	

Ресурсы проекта

- Ролевые ресурсы
- Конкретные исполнители
- Планирование в натуральных и стоимостных показателях
- Редактирование в редакторе планов
- Редактирование в табличном редакторе

Ресурсы проекта в табличном редакторе

Инвестиционный проект: Ресурсы: Редактор экономических данных


Дата актуальности: 01.10.2023

Ресурс	Начало	Завершение	Базовая ед. измерения	Группировка версий	Общий итог	До текущего периода	Итого	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Июнь 2024	Июль 2024	Август 2024	Сентябрь 2024
Элемент структуры плана					План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
					Факт + Прогноз	Факт	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
					Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение	Отклонение
Инженер			чел. ч		План	6 168,00		6 168,00								10,00	260,00	251,00	231,00
					Факт + Прогноз	6 168,00		6 168,00											
					Отклонение											-10,00	-260,00	-251,00	-231,00
Проектировщик			чел. ч		План	4 352,00	2 186,00	2 166,00	242,00	257,00	231,00	270,00	231,00	242,00	253,00	209,00			
					Факт + Прогноз	5 134,00	886,00	4 248,00	248,00	240,00	248,00	248,00	232,00	248,00	240,00	240,00	248,00	248,00	240,00
					Отклонение	782,00	-1 300,00	2 082,00	6,00	-17,00									
Замысел проекта, маркетинг	18.09.2023	21.11.2023			План	520,00	520,00												
					Факт + Прогноз	1 084,00	668,00	416,00	248,00	168,00									
					Отклонение	564,00	148,00	416,00	248,00	168,00									
Бизнес-планирование, инвестиции	22.11.2023	17.02.2024			План	704,00	704,00												
					Факт + Прогноз	922,00	218,00	704,00		72,00									
					Отклонение	218,00	-486,00	704,00		72,00									
Выделение земельного участка	18.02.2024	04.06.2024			План	864,00	864,00												
					Факт + Прогноз	864,00		864,00											
					Отклонение		-864,00	864,00											
Разработка проекта	05.06.2024	13.10.2024			План	1 048,00	98,00	950,00	242,00	257,00									
					Факт + Прогноз	1 048,00		1 048,00											
					Отклонение		-98,00	98,00	-242,00	-257,00									
Согласование и экспертиза проекта	14.10.2024	16.12.2024			План	512,00		512,00											
					Факт + Прогноз	512,00		512,00											
					Отклонение														
Выбор подрядчиков и заключение контрактов	17.12.2024	14.03.2025			План	704,00		704,00											
					Факт + Прогноз	704,00		704,00											
					Отклонение														

Табличный редактор ресурсов

- Настраиваемые структуры ресурсов, задач проекта и т.д.
- План/Факт+Прогноз
- Периоды редактора (*период проекта, текущий период и период обработки; разные периоды в группировках*)
- Актуализация по факту с перепланированием
- Комментарии к ячейкам

Загрузка по проекту по выделенным ресурсам

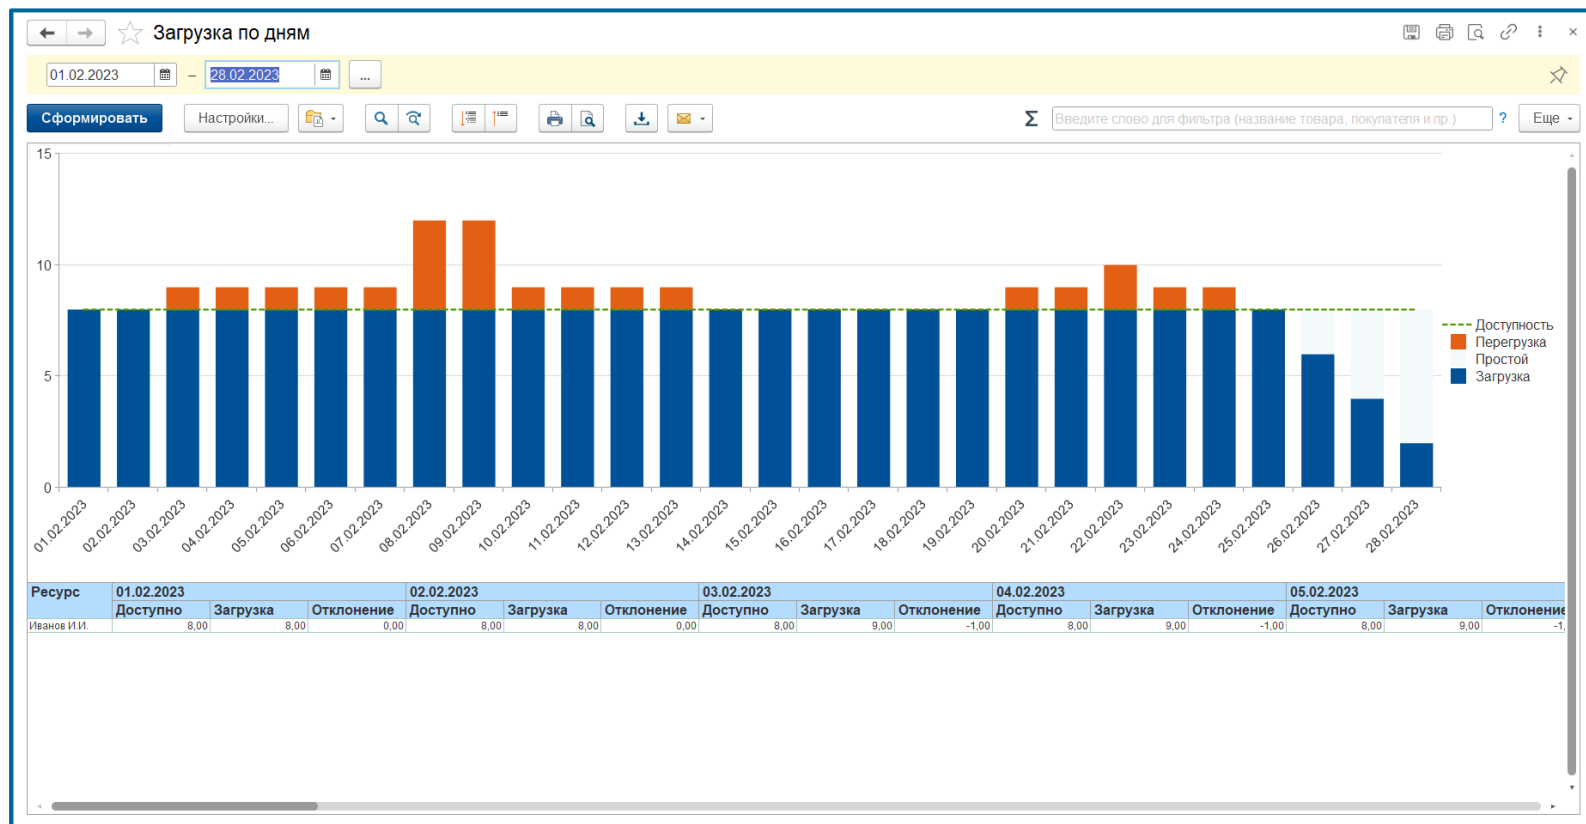

Отчет «Анализ загрузки ресурсов» позволяет произвести анализ загрузки по проекту и выделенных на проект ресурсов



Задания

Задания для: Обследование территории заказчика

Создать Обновить Открыть

Автор: Исполнитель: Вид задания: Задания по ресурсу: Текущий Назначенные Все

Задание	№	План	Элемент плана	Объект	Исполнитель	Начало план	Окон...	Статус задания	Вид задания
Инженер									
Жду действий от других									
Обследование территории заказчика	-		Обследование территории заказчика	Инжиниринг для ООО "Изумруд"	Инженер	26.02.2024	28.02.2024	Выдано	Поручение

Введите в это поле комментарий к изменению статуса.

Отменить Уточнить

Комментировать

26 февраля 2024 г. 14:25:38

Иванов И.И.
Выдано

Система позволяет создавать и хранить проектные задания

Задания

← →

☆ Все задания

Создать

Обновить

Открыть

Настройка

Еще

?

Чат

Автор:

Исполнитель:

Вид задания:

Задания по ресурсу: Текущий Назначенные Все

Подготовить смету по образцу M17

Задание	№	План	Элемент плана	Объект	Исполнитель	Окон...	Статус задания	Вид задания
Жду действий от других								
Согласование 1	-						На согласовании	Согласование
Иванов И.И.								
Нужны действия от меня								
Составить итоговый отчет по Этапу 1	-	Подготовка производств...	Проектирование и разра...		Иванов И.И.	1 22.09.2023	Завершено	Поручение
Подготовиться к командировке	-	Проект "Чистый лист" (Д...	Встреча		Иванов И.И.	2 02.02.2024	Выдано	Поручение
Инженер								
Петров П.П.								
Нужны действия от меня								
Подготовить смету по образцу P1	-	Подготовка производств...	Проектирование и разра...		Петров П.П.	2 25.09.2023	Уточняется	Поручение
Сидоров С.С.								
Жду действий от других								
Подготовить смету по образцу M17	-	Подготовка производств...	Проектирование и раз...		Сидоров ...	1 20.09.2023	Выполняется	Поручение

Введите в это поле комментарий к изменению статуса.

Отменить Уточнить

Комментировать

Задания предназначены для ввода и учета внутренних работ проектного офиса. Задания могут быть привязаны к проекту или проектной задаче, или быть самостоятельной единицей

Учет рабочего времени – таблицы

←

→

☆

Табель учета рабочего времени 000000001 от 19.09.2023

Провести и закрыть

Записать

Провести

Еще ▾

?

День: 19.09.2023

Исполнитель: Иванов И.И.

Подразделение:

Рабочих часов по календарю: 8,00

Отмечено часов: 8,00

Добавить

Обед

Учитывать тек. время

Заполнить

Доп. информация

Еще ▾

Проект	Задача	Ресурс (план)
Подготовка производства для ...	Проектирование и разработка о...	50,00
Подготовка производства для ...	Проектирование и разработка о...	58,00
Проект в развитие	Проект в развитие	25,00

Длительность	Начало	Задача	Комментарий
	Окончание	Проект	
2,50	09:00	Проектирование и разработка опыт...	Проектирование образца Р1
	11:30	Подготовка производства для корп...	
3,25	11:30	Проектирование и разработка опыт...	Проектирование оразца М17
	14:45	Подготовка производства для ООО ...	
1,00	14:45		Обед
	15:45		
2,25	15:45	Проект в развитие	Подготовка отчета по проекту
	18:00	Проект в развитие	


Документ списания ресурсов:

Табель учета рабочего времени позволяет вести учет рабочего времени по проектам и предназначен для ввода данных о распределении рабочего времени, затраченного трудовым ресурсом, в течении рабочего дня, а также для ввода в систему данных о потерянном (затраченном непродуктивно) рабочем времени



Управление бюджетами проекта

«1С:PM Управление проектами», редакция 5

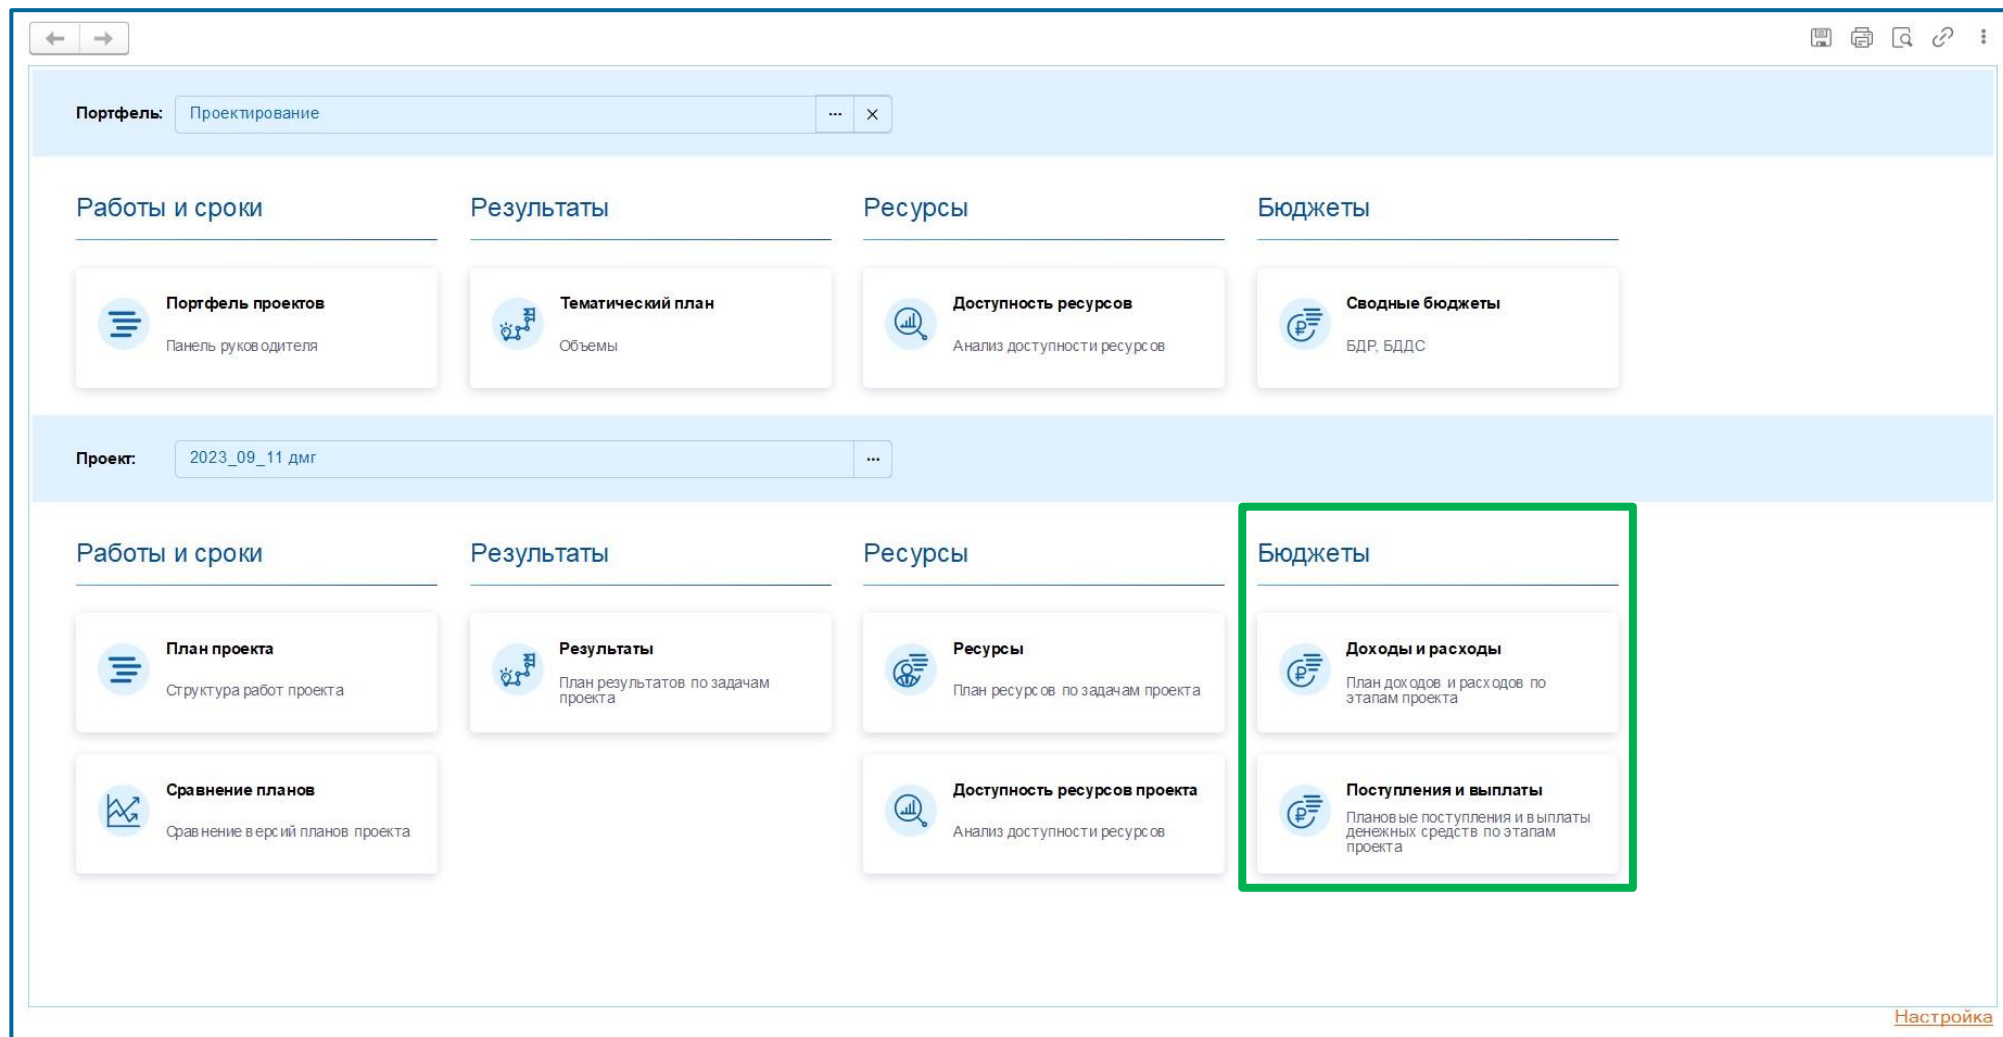

Проектное бюджетирование в структуре проекта

Рабочий сетевой график - Инжиниринг для ООО "Изумруд": Редактор планов

Сценарий Прогноз

Старт: Пт 1.03.24

N	Элемент плана	Длительность задачи		Период задачи		Ресурсы		Результаты		Экономические данные		2024 г. 1 кв. Март
		Длит.	Ед. измерения	Начало	Окончание	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Доход	Расход	
1	Рабочий сетевой график - Инжиниринг для ООО "Изумруд"											
2	Инжиниринг для ООО "Изумруд"	193,00	День	01.03.2024	26.11.2024	Менеджер п	2 201 419	Комплект пр	3 386 299	3 386 299	3 011 357	
3	Проектирование	75,00	День	01.03.2024	13.06.2024	Проектиров	414 900	Комплект пр	670 000	670 000	650 370	
4	Начало проектирования		День	01.03.2024	01.03.2024							
5	Обследование территории заказчика	24,00	День	01.03.2024	03.04.2024	Проектировщ	118 800				181 440	
6	Создание комплекта проектной докум	39,00	День	04.04.2024	28.05.2024	Проектировщ	163 800				247 940	
7	Утверждение комплекта разработанны	12,00	День	29.05.2024	13.06.2024	РП проектов	37 800				68 140	
		5,00	День	01.03.2024	13.06.2024	РП проектов	94 500				152 850	
		3,00	День	14.06.2024	02.07.2024	Менеджер п	1 571 549	Комплектую	1 999 999	1 999 999	1 747 526	
		4,00	День	14.06.2024	14.06.2024							
		4,00	День	14.06.2024	19.06.2024	Менеджер по	1 504 314				1 621 610	
		4,00	День	20.06.2024	25.06.2024	Менеджер по	12 800				31 460	
		5,00	День	26.06.2024	02.07.2024	Аренда грузо	26 400				38 010	
		3,00	День	14.06.2024	02.07.2024	Проектировщ	28 035				56 446	
		5,00	День	02.07.2024	02.07.2024							
		5,00	День	03.07.2024	17.09.2024	Проектиров	57 770	Установленн	250 500	250 500	189 101	
		0,00	День	03.07.2024	13.08.2024	Рабочий (116	14 500				62 850	
		5,00	День	14.08.2024	17.09.2024	Рабочий (200	25 000				57 500	
		5,00	День	03.07.2024	17.09.2024	Проектировщ	18 270				68 751	
		5,00	День	18.09.2024	08.10.2024	РП проектов	37 700	Завершеннь	92 000	92 000	89 010	
		5,00	День	18.09.2024	08.10.2024	Рабочий (100	12 500				26 250	
		5,00	День	18.09.2024	08.10.2024	РП проектов	25 200				62 760	
		5,00	День	09.10.2024	15.10.2024	РП проектов	45 000	Объект при-	175 000	175 000	158 500	
		5,00	День	09.10.2024	15.10.2024	Проектировщ	19 800				40 740	
		4,00	День	09.10.2024	14.10.2024	РП проектов	25 200				117 760	
		0,00	День	16.10.2024	26.11.2024	Рабочий (200	74 500	Обучение (у	198 800	198 800	176 850	
		0,00	День	16.10.2024	12.11.2024	Рабочий (200	25 000				67 500	
		0,00	День	13.11.2024	26.11.2024	Тренер (180)	43 200				81 160	
		0,00	День	16.10.2024	26.11.2024	РП проектов	6 300				28 190	

Проектное бюджетирование

- Ведение БДР, БДДС проекта
- Формирование БДР проекта на основании ресурсных планов и плана объемов
- Формирование БДДС проекта на основании БДР и условий оплат
- 3-х валютный учет (в валюте управленческого учета, рег. учета и в валюте операции)
- Выделение НДС в экономических данных
- Редактирование в редакторе планов
- Редактирование в табличном редакторе

Проектное бюджетирование в табличном редакторе

Табличный редактор бюджетов

- Настраиваемые структуры статей бюджета, задач проекта, подразделений и т.д.
- План/Факт+Прогноз
- Периоды редактора (*период проекта, текущий период и период обработки; разные периоды в группировках*)
- Актуализация по факту с перепланированием
- Комментарии к ячейкам



Трансляция ресурсов и результатов

Настройки РМ5

Записать и закрыть | Записать

Общие | Учет рабочего времени | Управление договорами | Проектное бюджетирование | Панель руководителя | Направления деятельности | Параметры синхронизации по умолчанию | Настройки роли

Модель управления:

Календарь по умолчанию:

Использовать связь объекта с планом:

Цикла статуса готовности по умолчанию:

Валюта регламентированного учета:

Валюта управленческого учета:

Опция расчета элементов по умолчанию:

Метод расчета сроков по умолчанию:

Внешние связи планов:

Вариант расчета внешних связей:

Цент критического пути по умолчанию:

Создать

Сценарий планирования:

Сценарий Прогноз

Способ редактирования элемента в редакторе:

Отложенная синхронизация поручений с проектом:

Разрешить создание обсуждений без указания:

Простая модель (Модели управления)

Основное | Задания | Дисциплинарная филья

Записать и закрыть | Записать | Создать на основе

Связь объектов и планов:

Настройки статусов | Настройки команды

Код: 000000001

Наименование: Простая модель

Трансляция (Настройки трансляции результатов работ и ресурсов в БДР)

Записать и закрыть | Записать

Наименование: Трансляция

Доход	Расход
Добавить	Добавить
Вид элемента активности	Вид движения
Этап	Результаты работ
Разреш источник	Разреш приемник
Основной	Основной
Вид ресурса	Вид исполнителя
Этап	Результаты

Исходные данные


Ok | Отмена

Поиск (Ctrl+F)

	Вид движения	Элемент структуры плана	Статья	Ресурс	Базовая единица	Кэф. единицы	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Валюта
	Доход	Проектирование	Доход	Инженер	чел. ч	1,000	5 760,00	20%	960,00	4 800,00	5 760,00	RUB
	Доход	Проектирование	Доход	Проектировщик	чел. ч	1,000	10 080,00	20%	1 680,00	8 400,00	10 080,00	RUB
	Доход	Проектирование	Доход	РП проектов инжиниринга	чел. ч	1,000	20 160,00	20%	3 360,00	16 800,00	20 160,00	RUB
							36 000,00		6 000,00	30 000,00	36 000,00	

Настройка трансляции позволяет относить доходы и расходы как на конкретную задачу, так и на этап

Монитор проекта

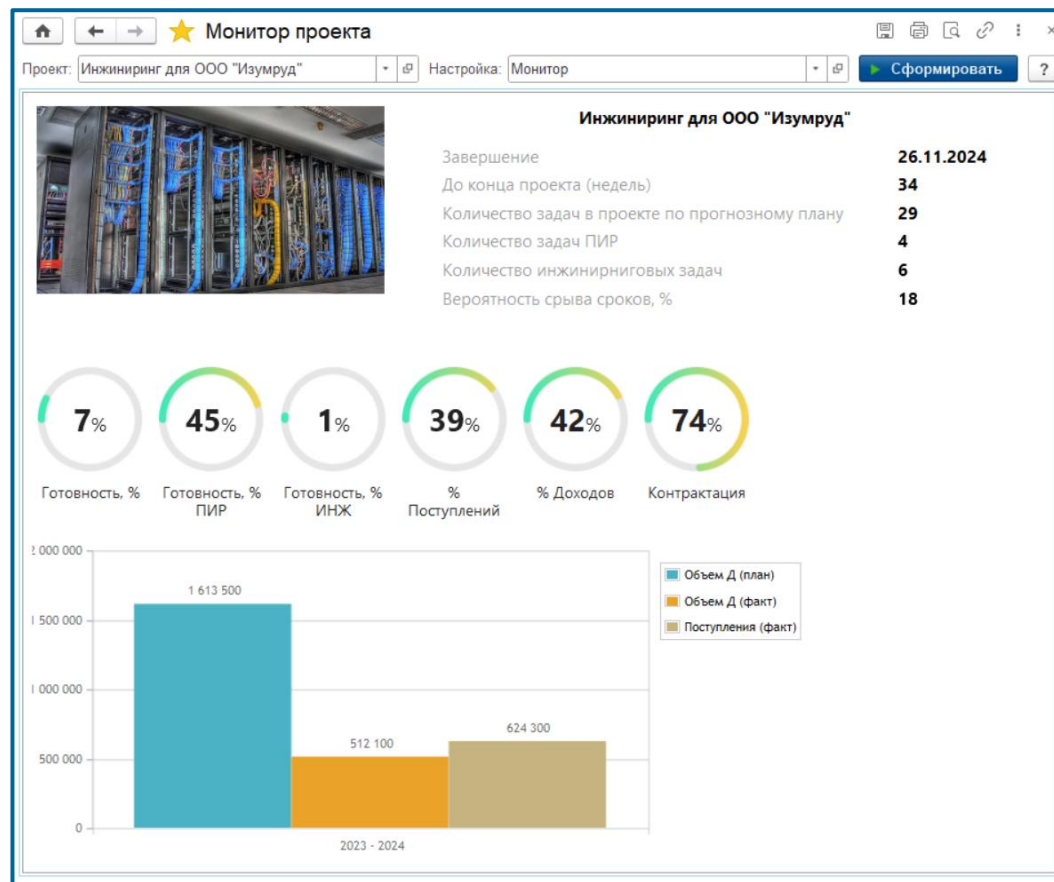

Визуальный инструментарий системы позволяет руководителю получить информацию о проекте в разных представлениях, одно из них – **монитор проекта**



Панель руководителя и портфель проектов

«1С:PM Управление проектами», редакция 5

← →

🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮

Портфель: Проектирование ... x

Работы и сроки

Результаты

Ресурсы

Бюджеты

📋 Портфель проектов
Панель рук оводителя

💡 Тематический план
Объемы

📊 Доступность ресурсов
Анализ доступности ресурсов

💰 Сводные бюджеты
БДР, БДДС

Проект: 2023_09_11 дмг ...

Работы и сроки

Результаты

Ресурсы

Бюджеты

📋 План проекта
Структура работ проекта

📊 Сравнение планов
Срав нение в ер сий планов проекта

💡 Результаты
План результатов по задачам проекта

📊 Ресурсы
План ресурсов по задачам проекта


💰 Доходы и расходы
План доходов и расходов по этапам проекта

📊 Доступность ресурсов проекта
Анализ доступности ресурсов

💰 Поступления и выплаты
Планов ые поступления и выплаты денежных средств по этапам проекта


[Настройка](#)

Панель руководителя

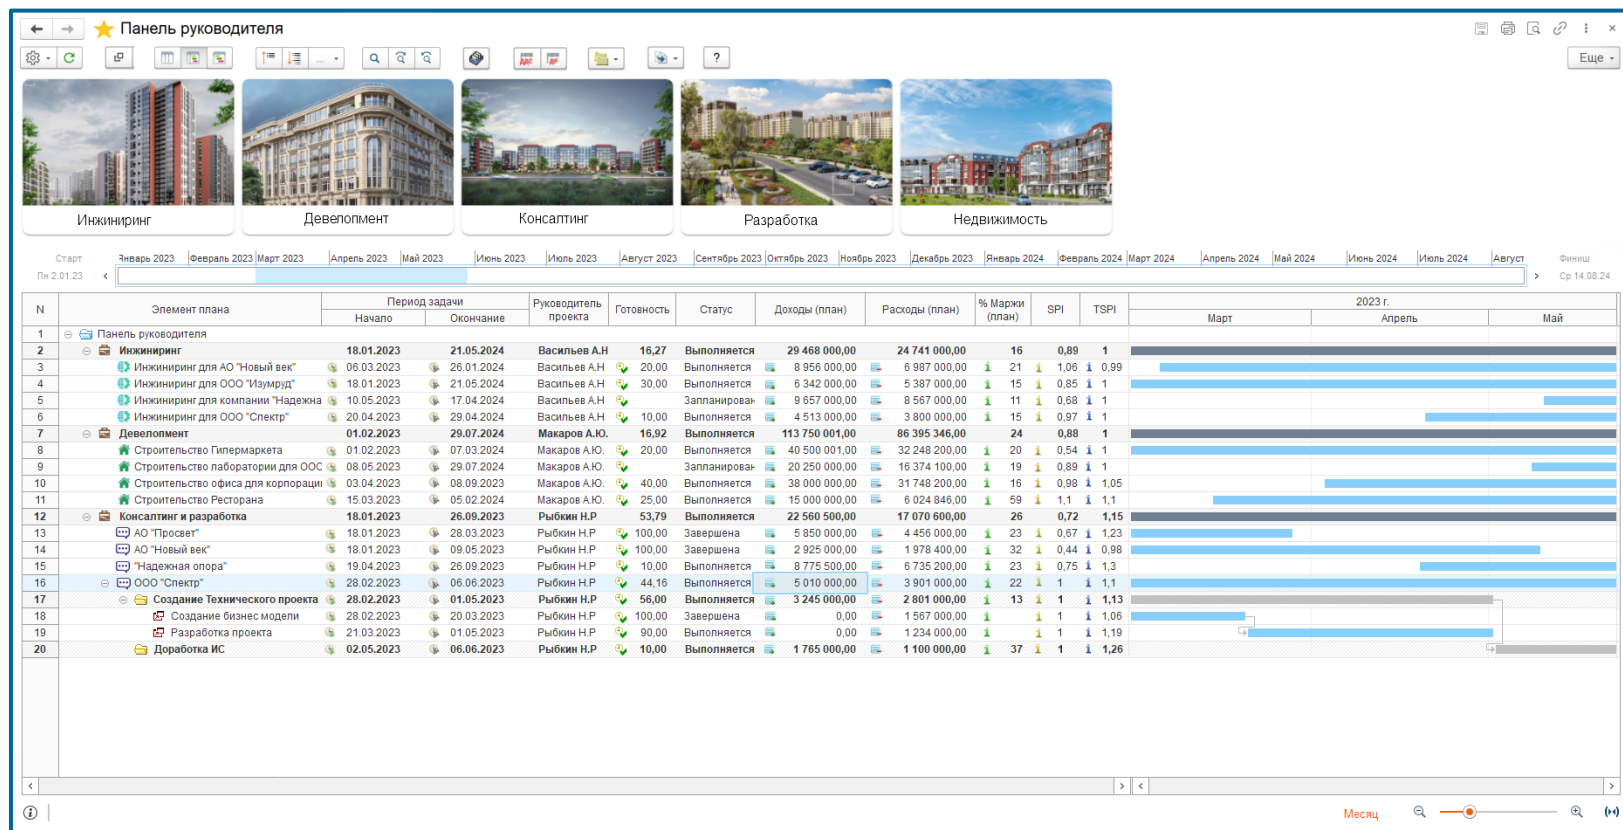

Рабочее место руководителя проектов содержит перечень паспортов проектов, которые позволяют фиксировать и хранить в системе общую информацию о проектах

«1С:PM Управление проектами», редакция 5

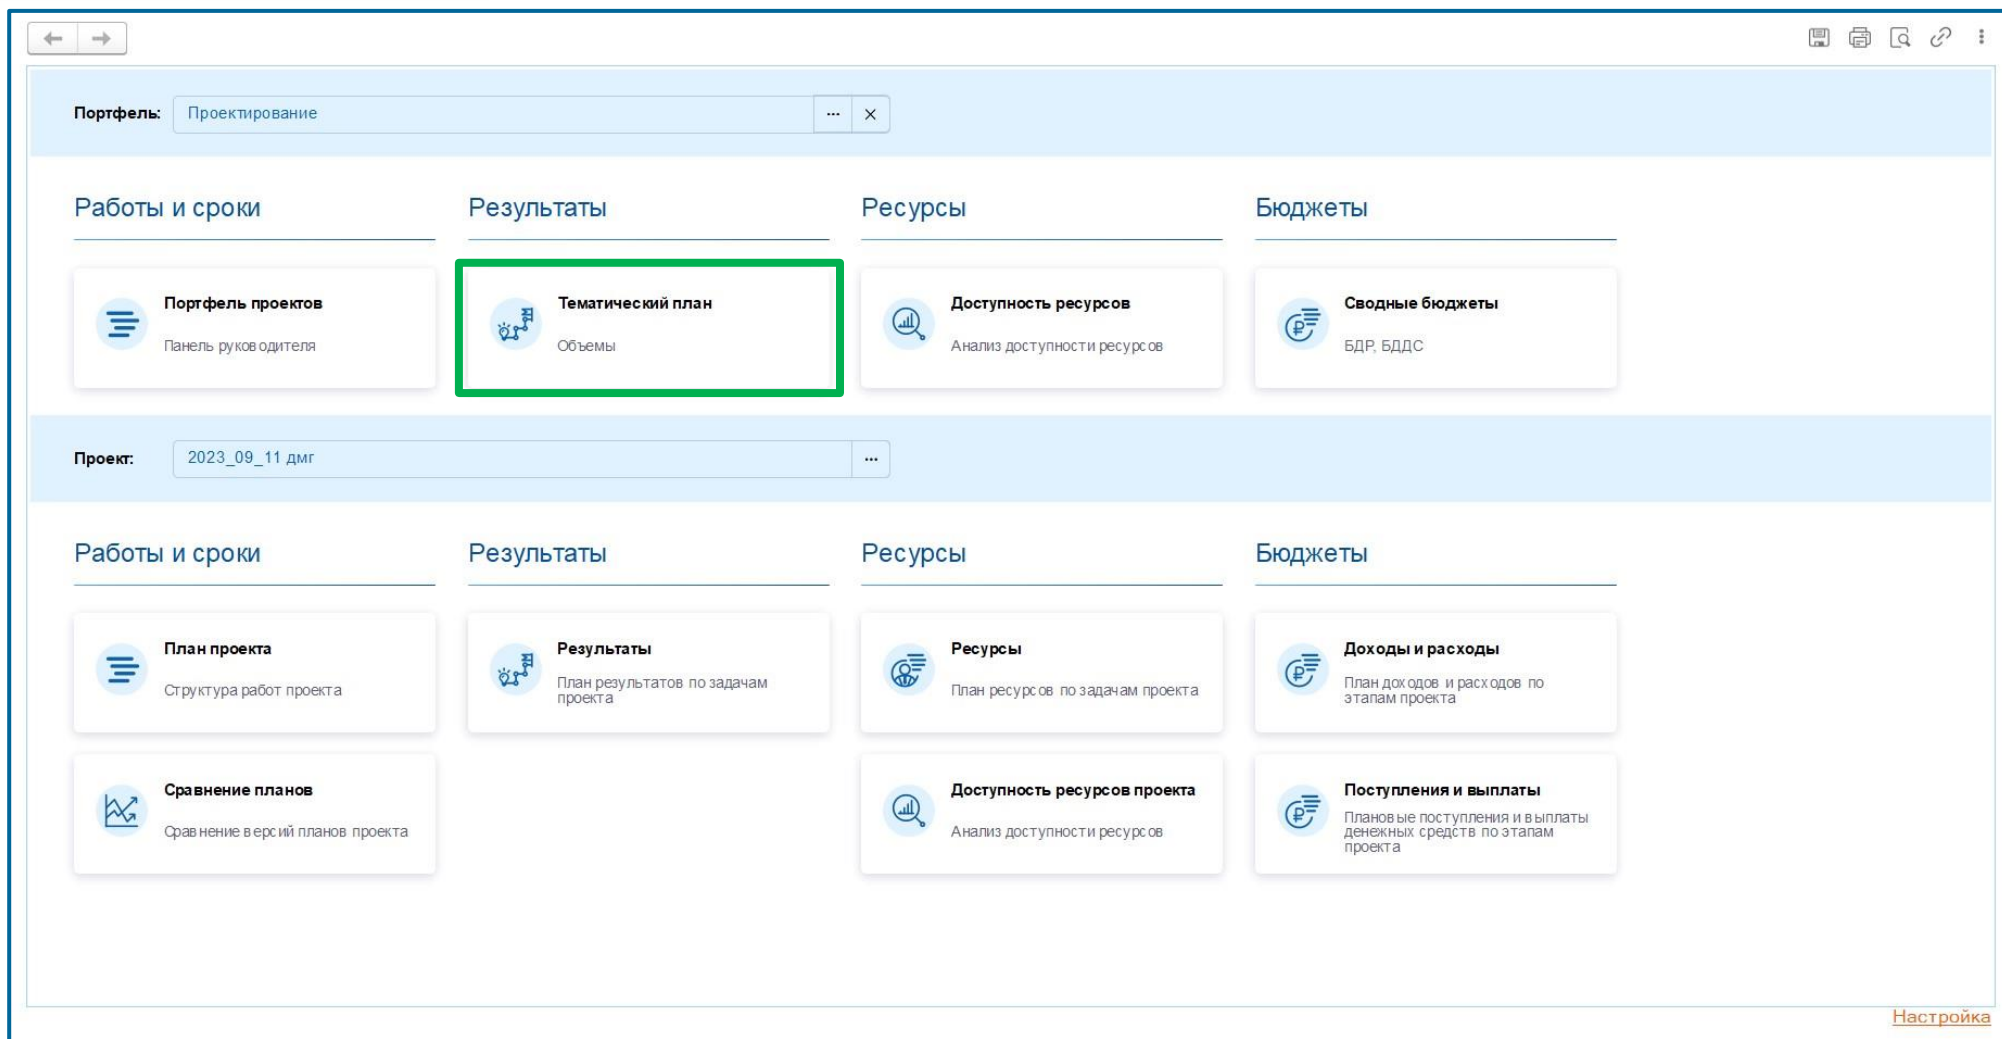


Тематический план

Тематический план предоставляет возможность формирования годового тематического плана по проектам, анализа доступности ресурсов по тематическому плану, план-фактного анализа исполнения тематического плана



Сводный проект

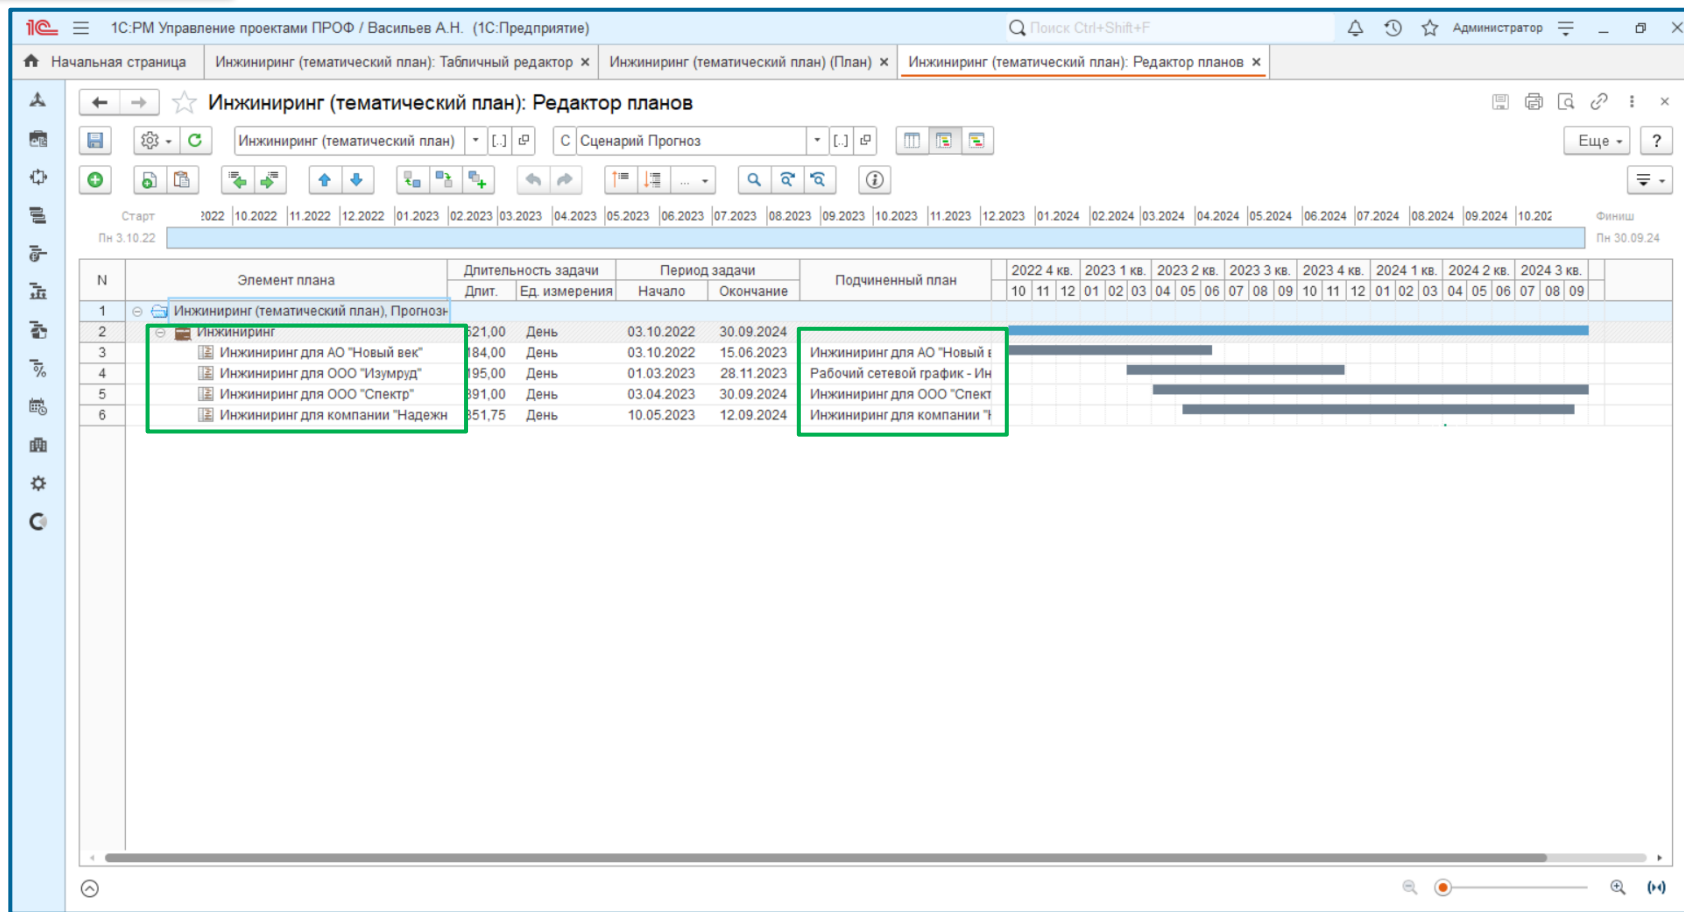

Конкретные элементы плана ссылаются на подчиненный план

Сводный проект

The screenshot displays the 1C:PM software interface for managing projects. The main window is titled "Инжиниринг (тематический план) - Тематический план: Редактор планов". A dialog box titled "Настройки трансляции данных" (Data Transfer Settings) is open, allowing users to configure data synchronization for various project metrics.

Настройки трансляции данных

- % готовности**
 - ☒ Транспиривать % готовности
- Сроки**
 - Актуализировать данные: Без ограничения От даты начала проекта
 - ☒ Транспиривать данные о сроках
- Ресурсы и результаты работ**
 - ☒ Транспиривать данные о результатах работ
 - ☒ Транспиривать данные о ресурсах
 - ☒ С учетом подчиненных
- БДР**
 - ☒ Транспиривать данные о доходах
 - ☒ Транспиривать данные о расходах
 - ☒ С учетом подчиненных
- БДДС**
 - ☒ Транспиривать данные о поступлениях
 - ☒ Транспиривать данные о выплатах
 - ☒ С учетом подчиненных
- Создание новых элементов**
 - ☐ Создавать новые элементы


The background interface shows a Gantt chart with a timeline from 2022 to 2024, displaying project tasks and their durations.

Система позволяет актуализировать текущий проект по данным





Система позволяет актуализировать текущий проект по данным

«1С:PM Управление проектами», редакция 5

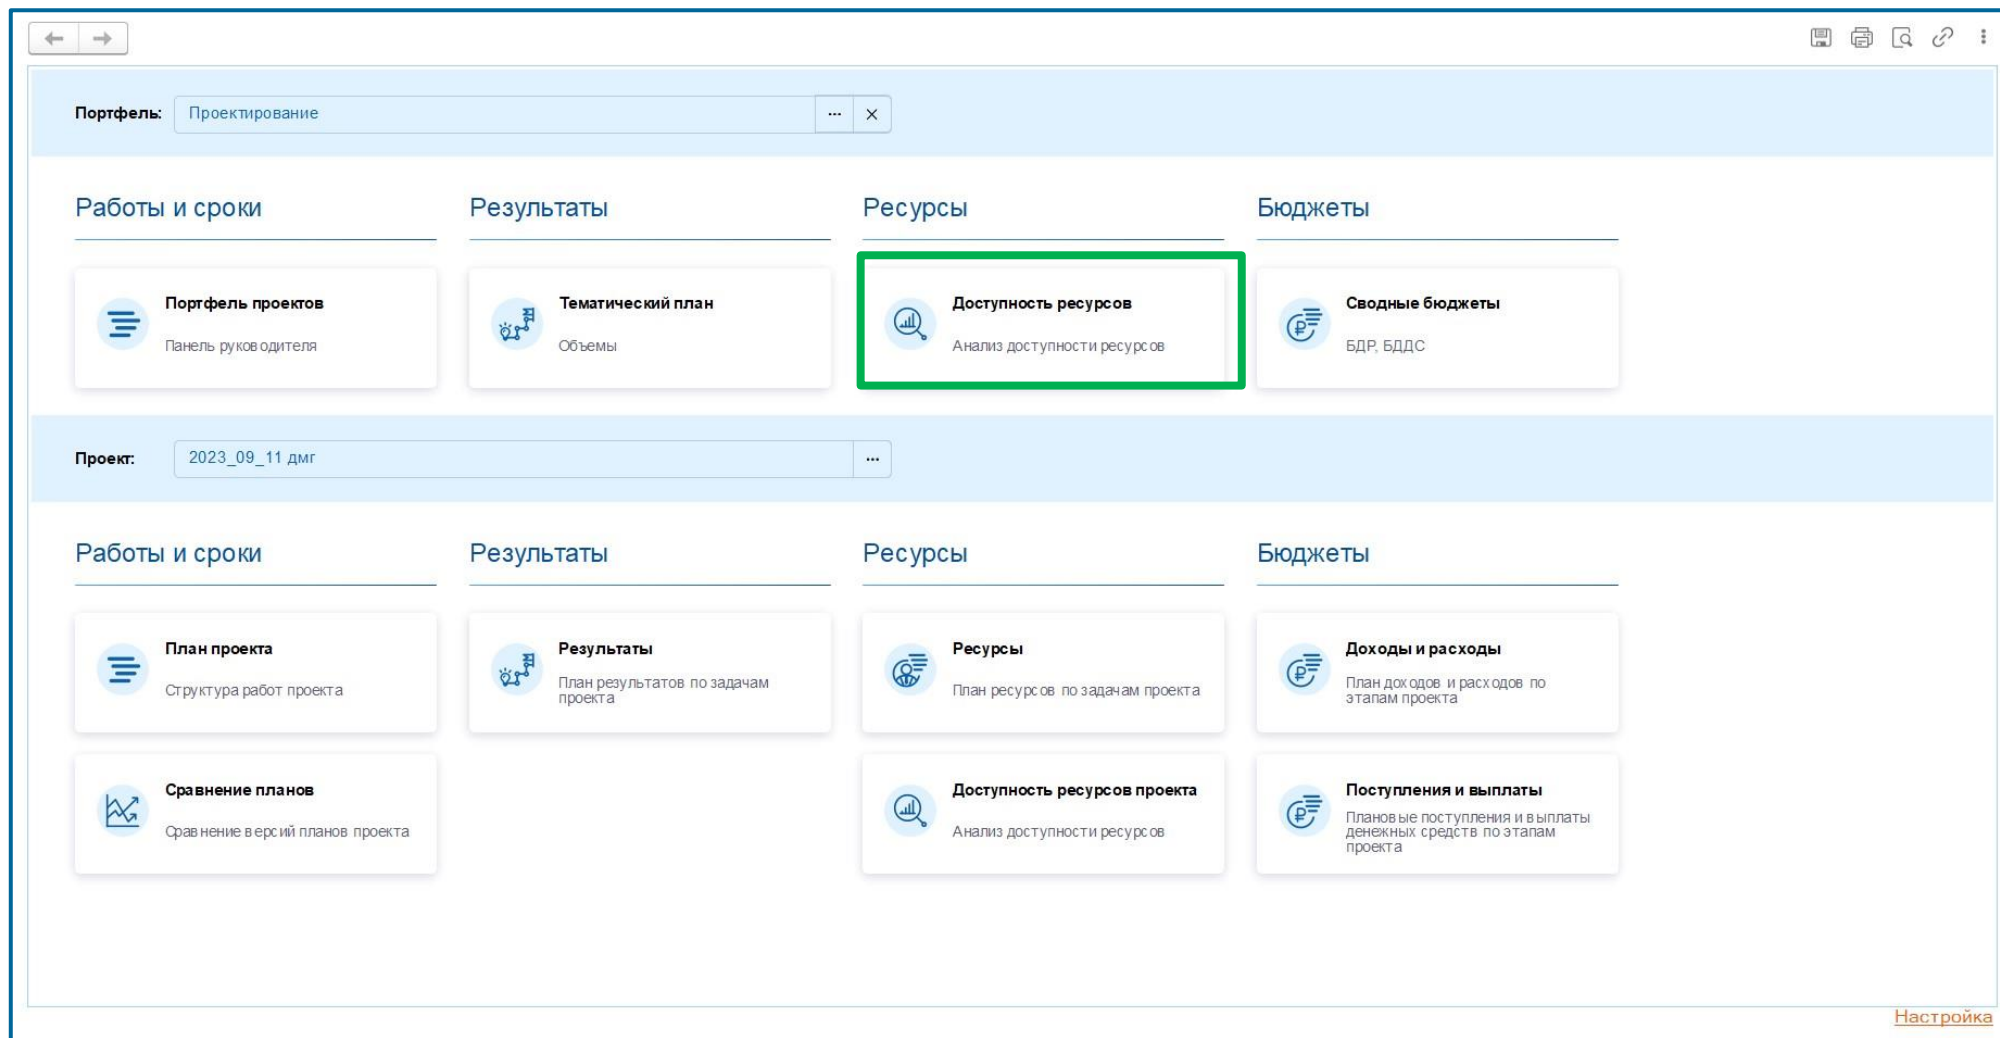


Загрузка по проектам

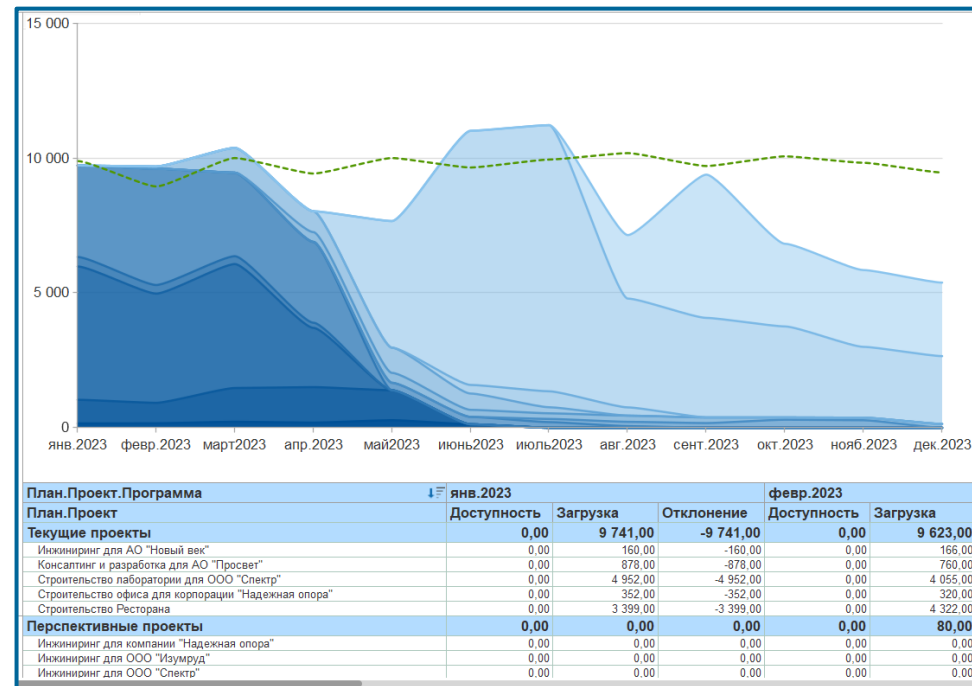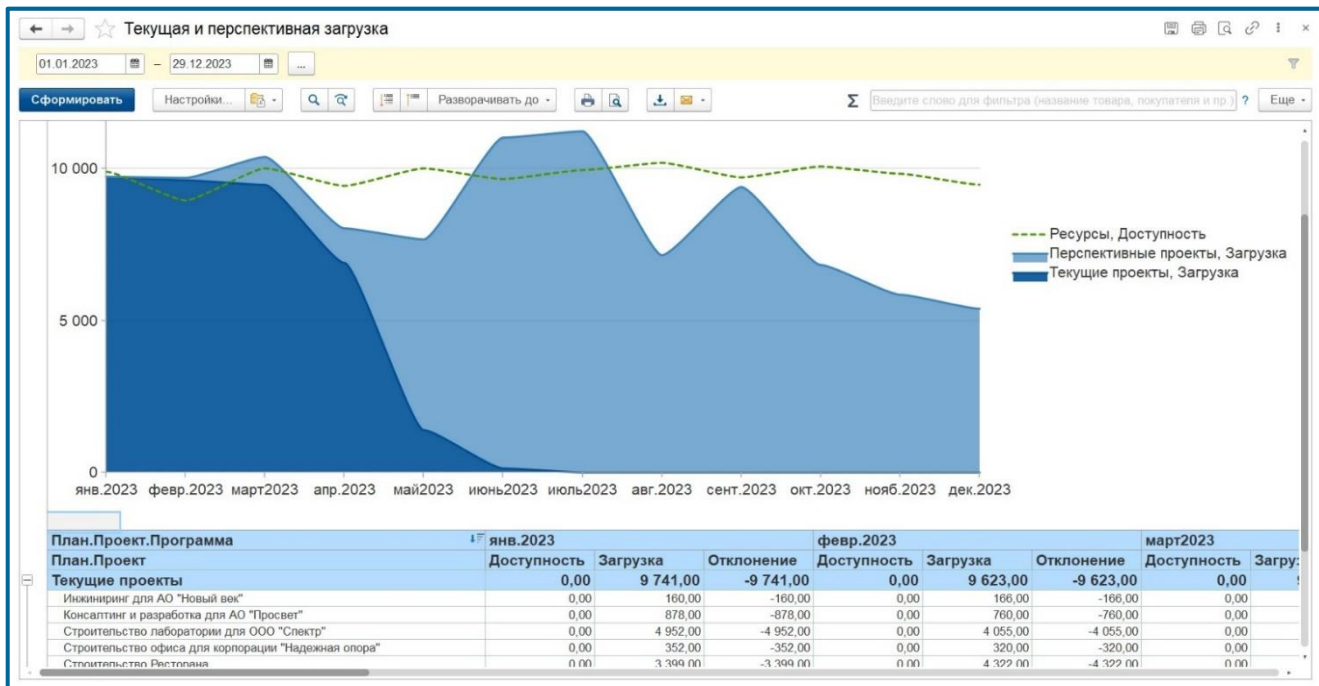



Отчет «Анализ загрузки ресурсов»:

- предусмотрен для анализа загрузки и выполнимости группы проектов в системе
- позволяет произвести анализ перегрузки и простоя ресурсов, назначенных на выполнение утверждённых, выполняемых и планируемых проектов, исходя из доступной мощности ресурсов предприятия

«1С:PM Управление проектами», редакция 5

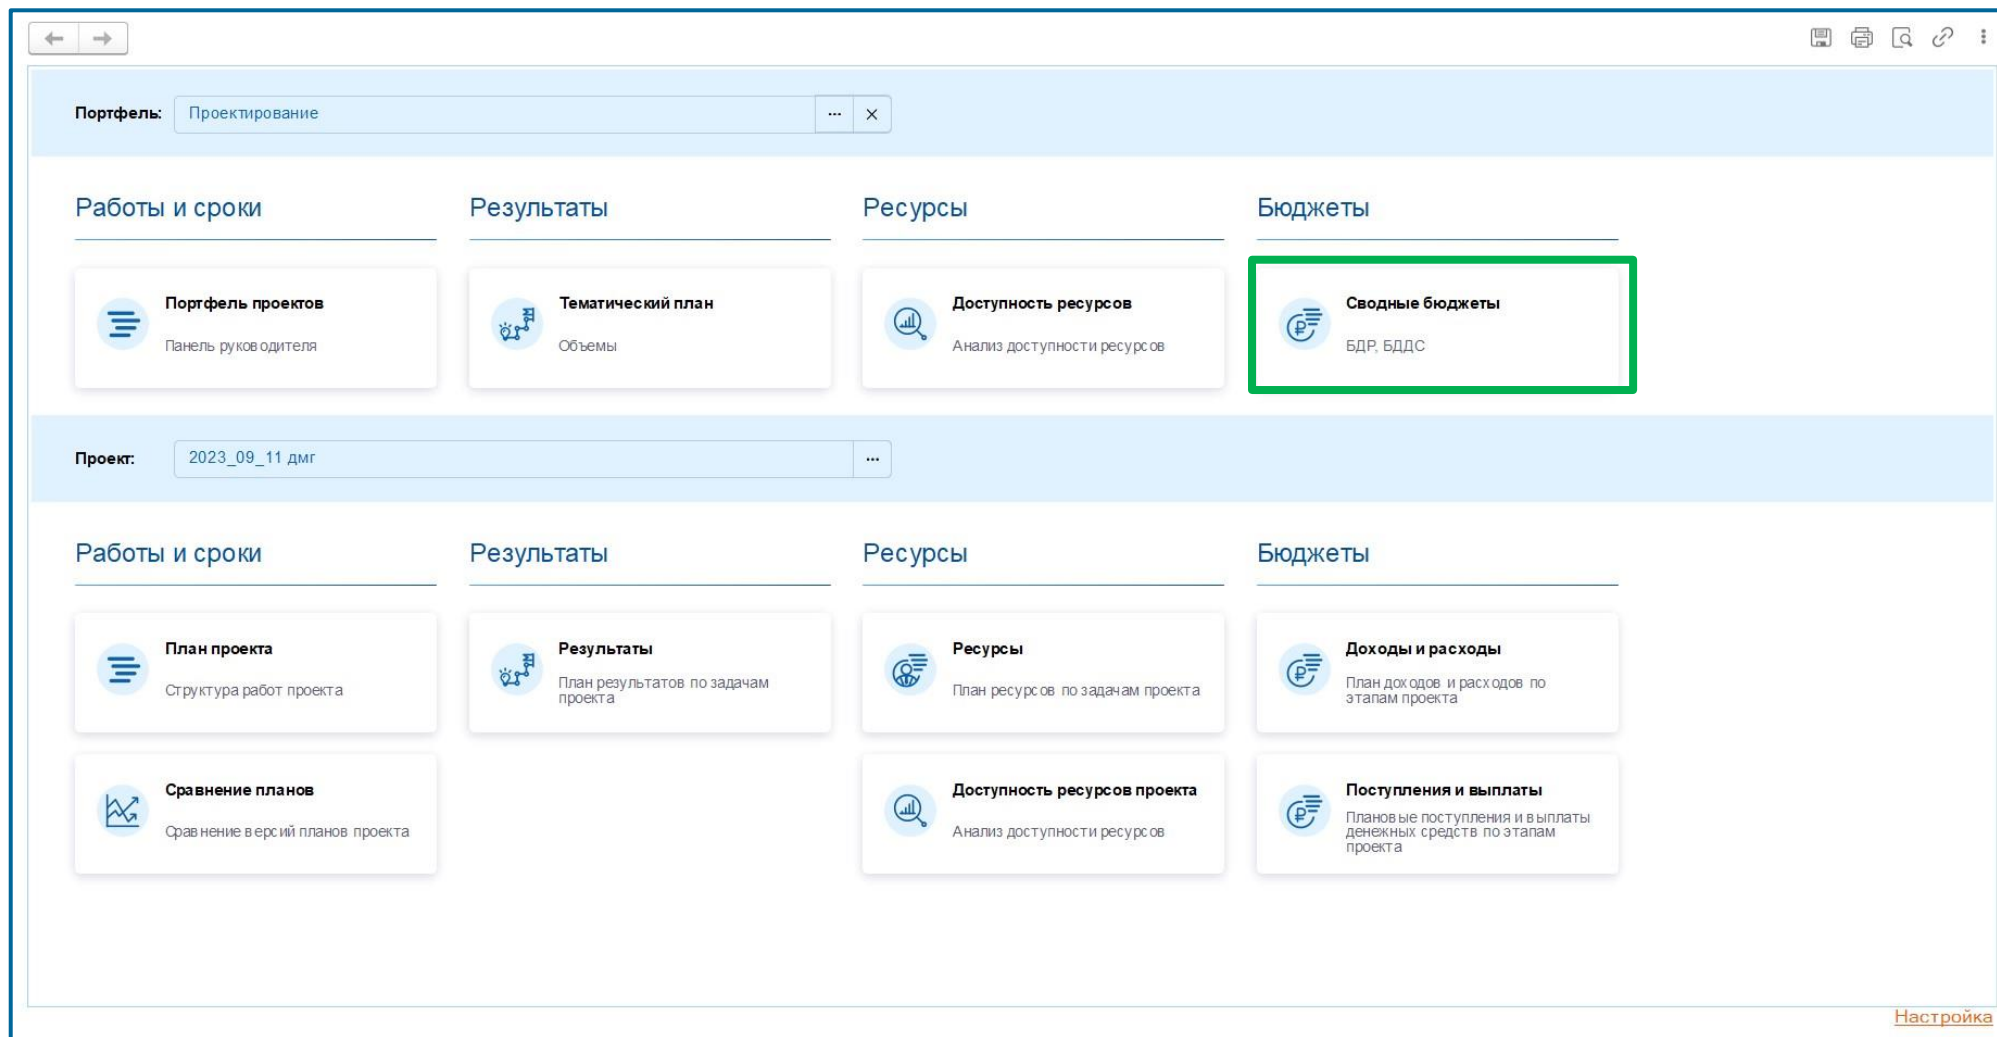


Сводный бюджет по портфелю

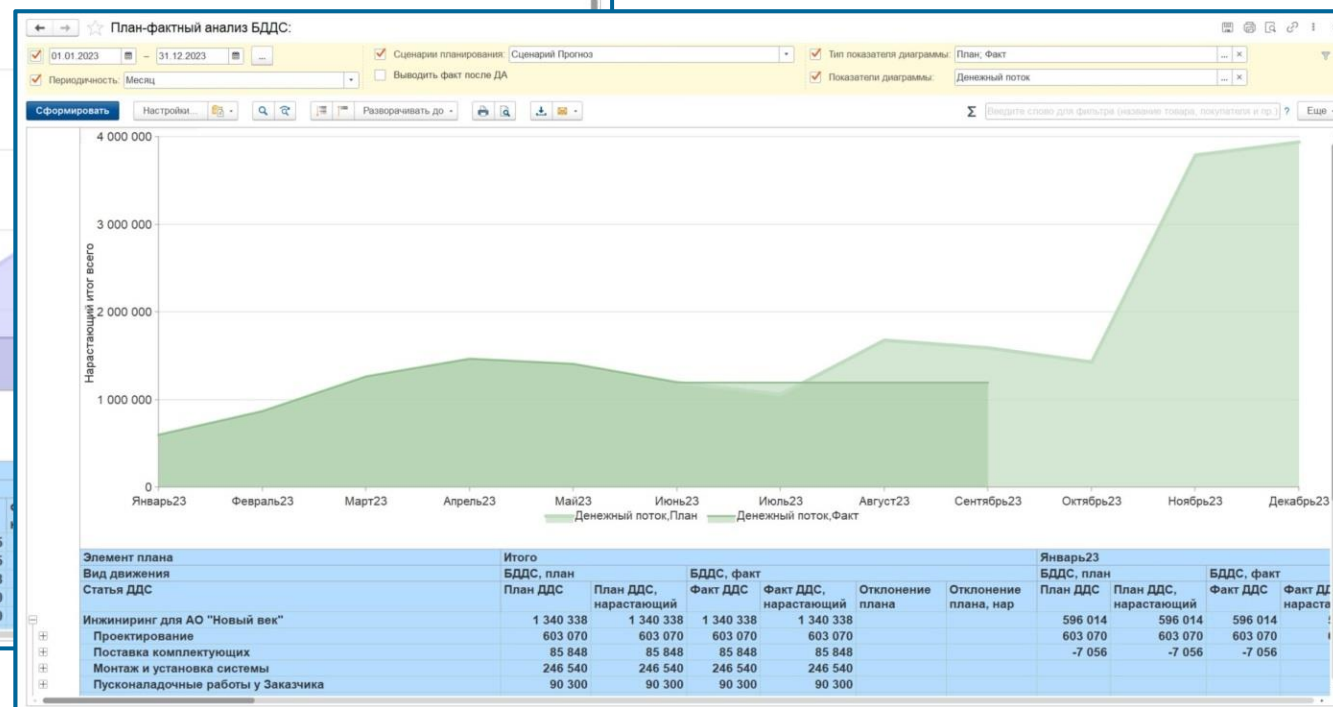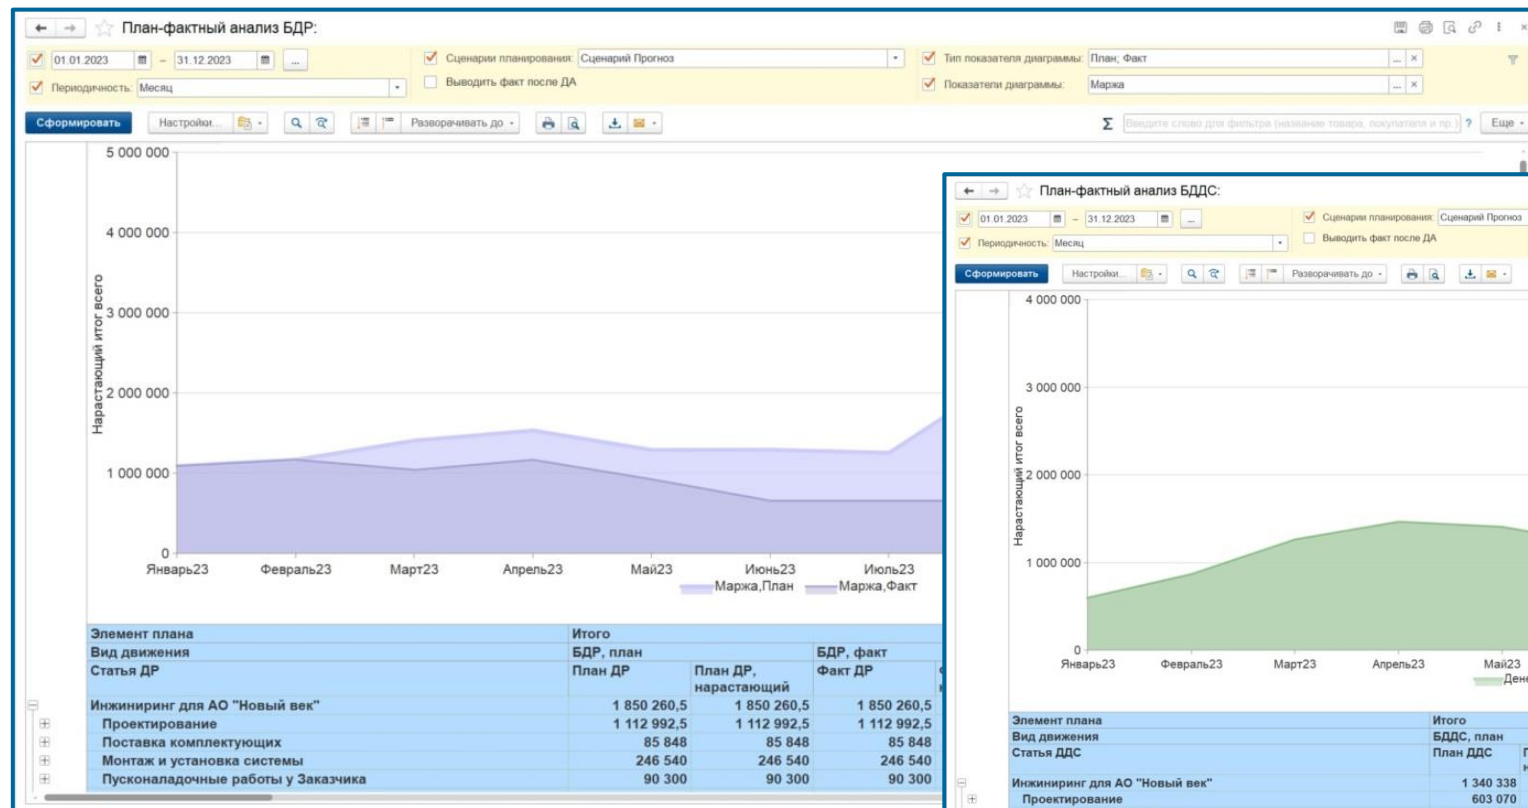

Можно получить сводные БДР и БДДС портфеля проектов, сопоставить плановые и фактические данные



Связанные проекты

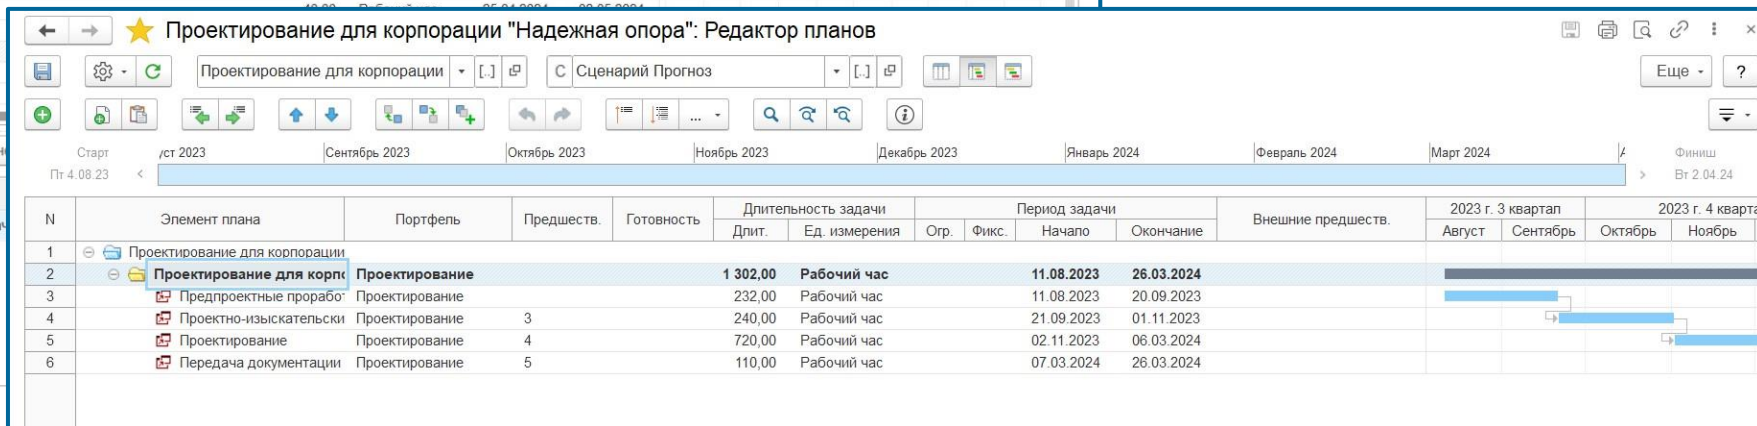


Связанные проекты – задачи плана одного проекта связаны связями (ОН, НО, НН, ОО) с задачами плана другого проекта



Многомерные проекты

Многомерный проект

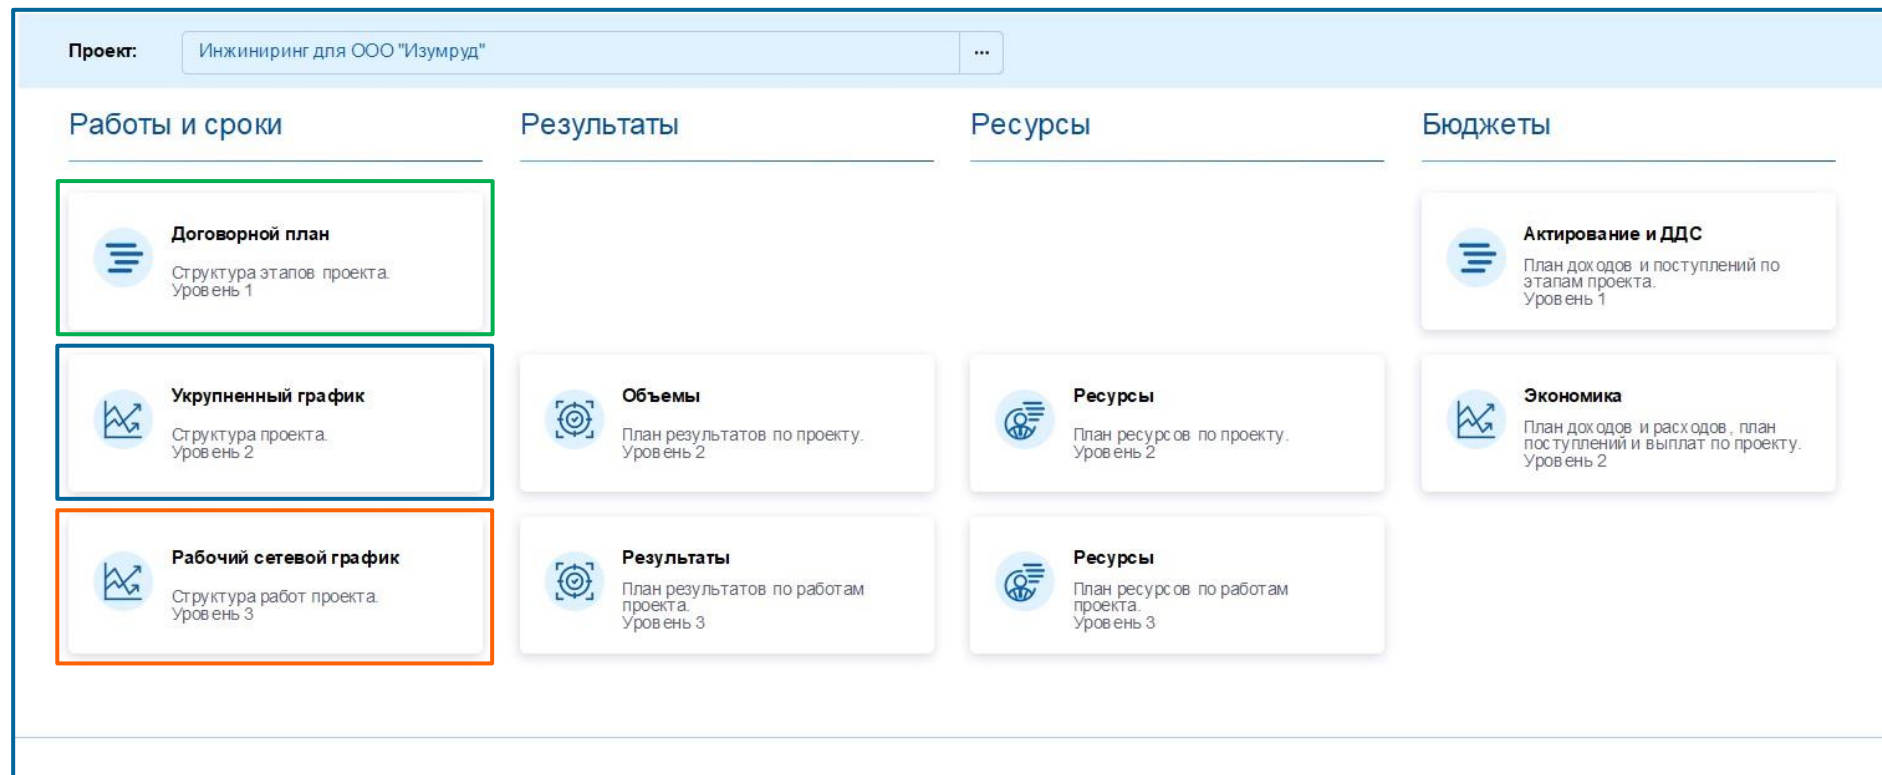

Многомерный проект – один проект, имеющий несколько взаимосвязанных планов с разными видами данных

Многомерный проект



Договорной план

Структура этапов проекта.
Уровень 1




Укрупненный график

Структура проекта.
Уровень 2



Рабочий сетевой график

Структура работ проекта.
Уровень 3

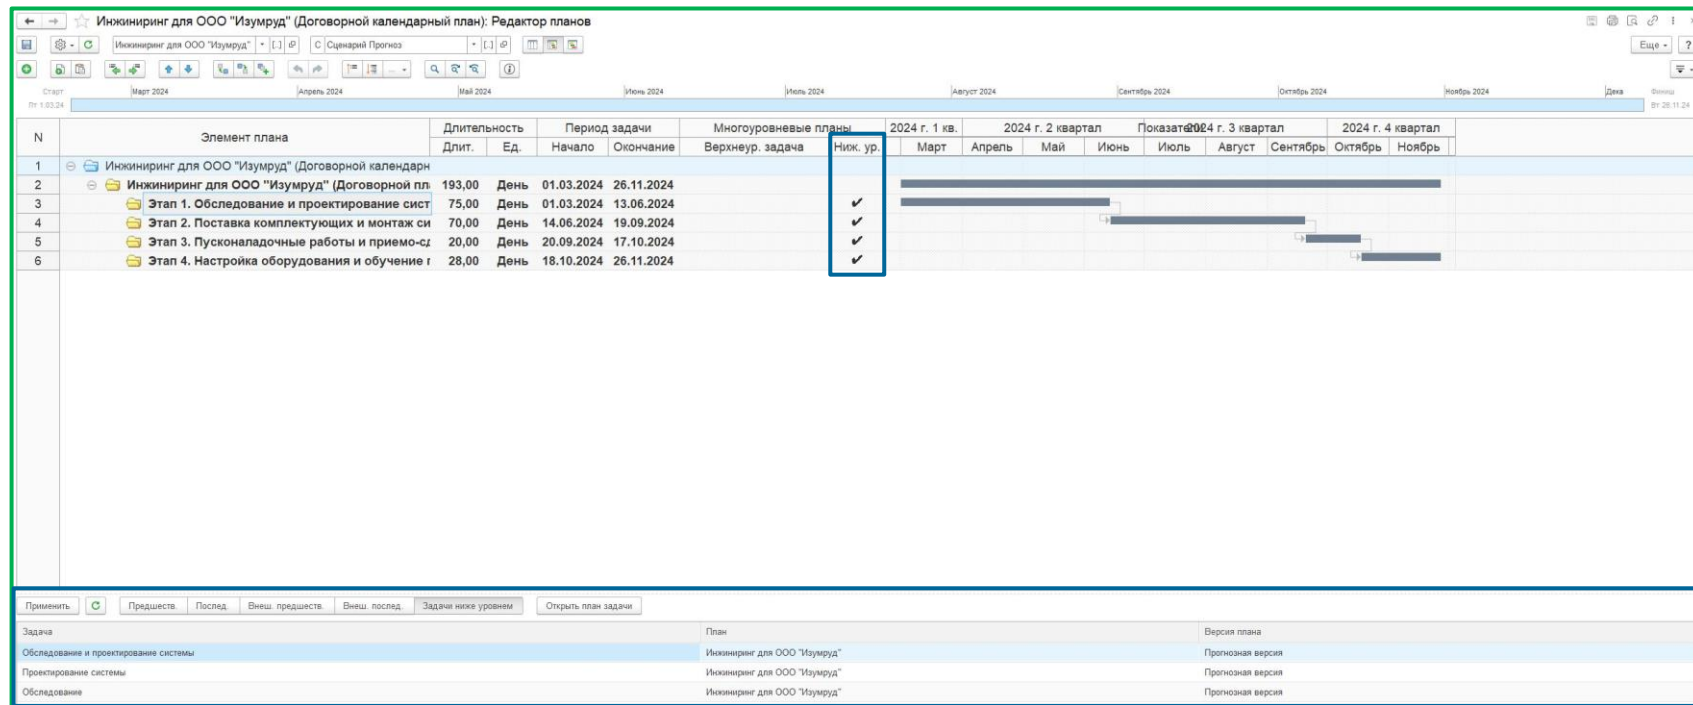

Задачи «нижестоящего» плана
ссылаются на задачи «вышестоящего» плана

Многомерный проект



Договорной план

Структура этапов проекта.
Уровень 1




Укрупненный график

Структура проекта.
Уровень 2



Рабочий сетевой график

Структура работ проекта.
Уровень 3

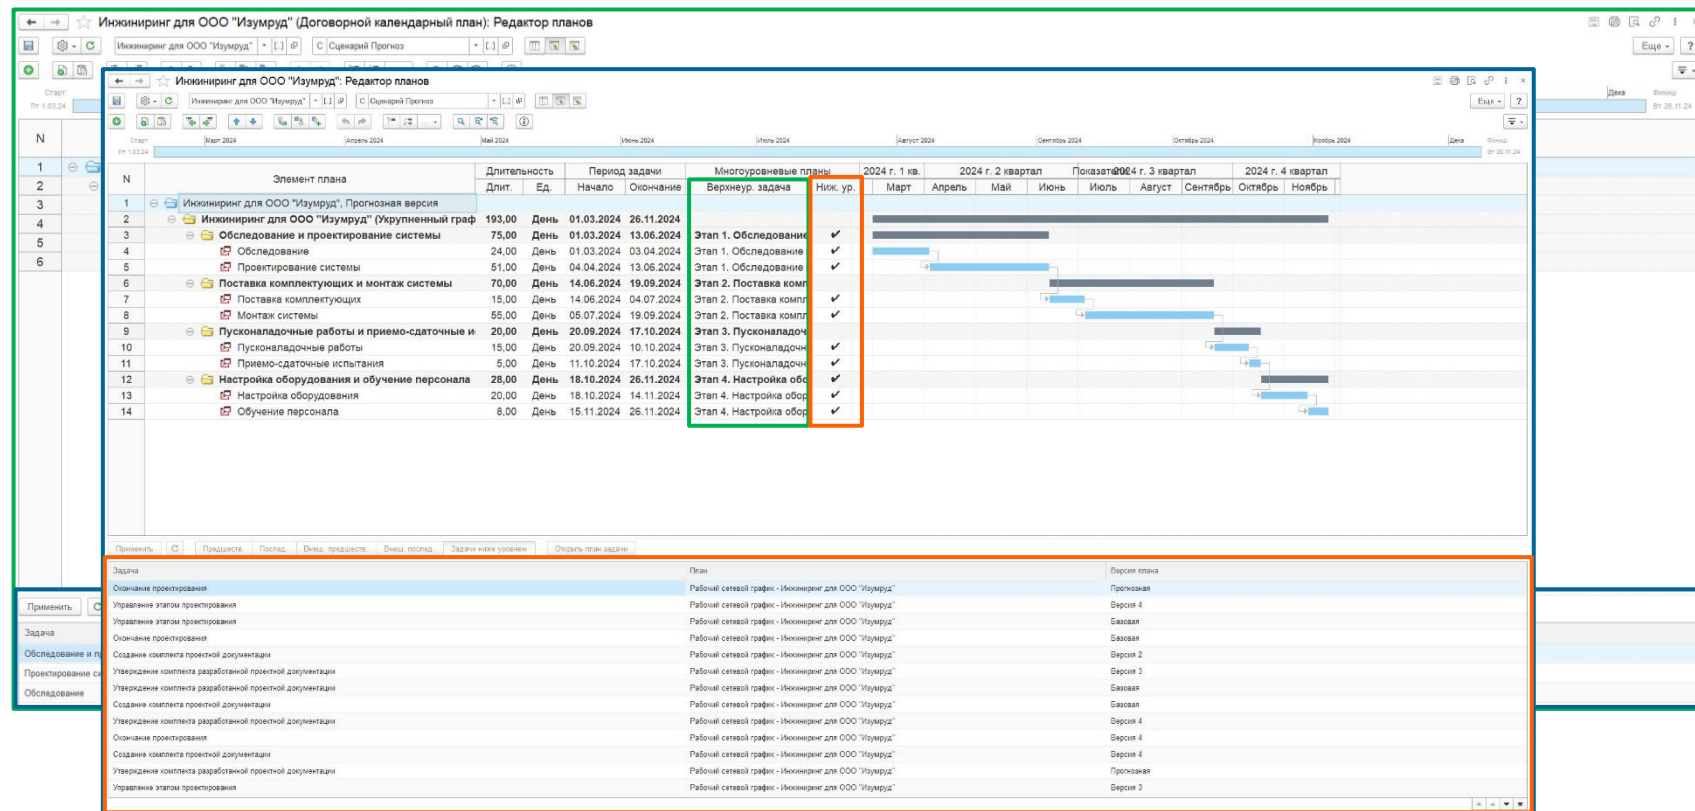

Задачи «нижестоящего» плана
ссылаются на задачи «вышестоящего» плана

Многомерный проект



Договорной план

Структура этапов проекта.
Уровень 1




Укрупненный график

Структура проекта.
Уровень 2



Рабочий сетевой график

Структура работ проекта.
Уровень 3

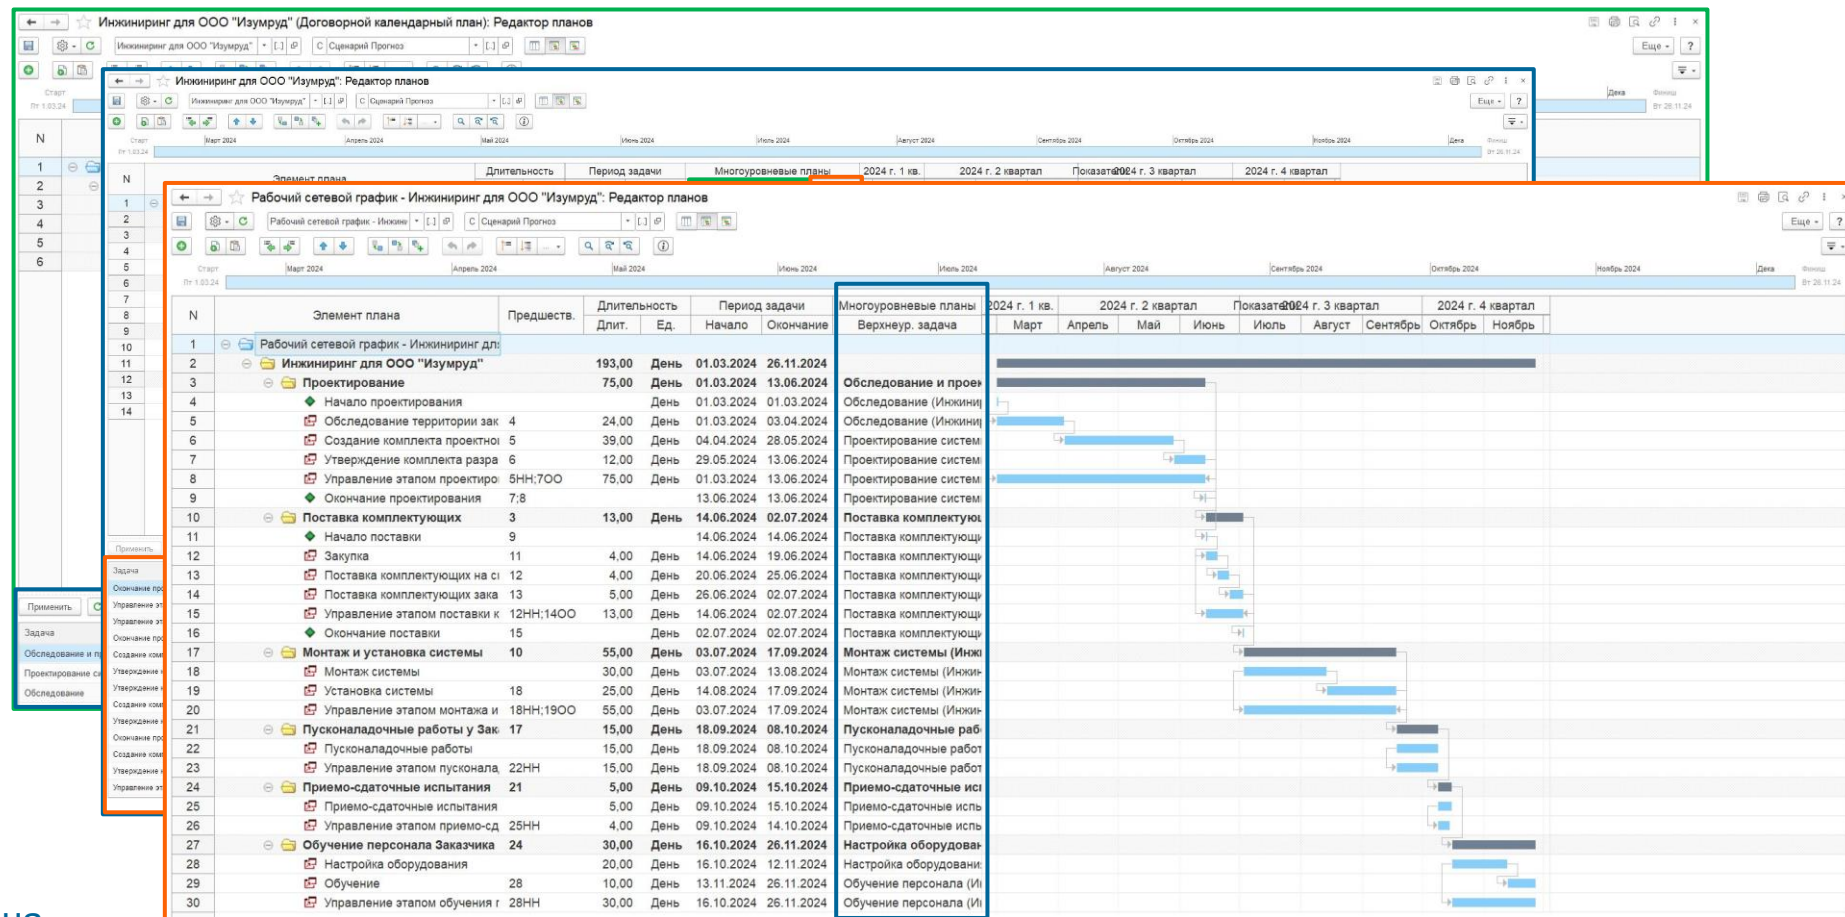


Задачи «нижестоящего» плана
ссылаются на задачи «вышестоящего» плана




Интеграции

Интеграционный потенциал

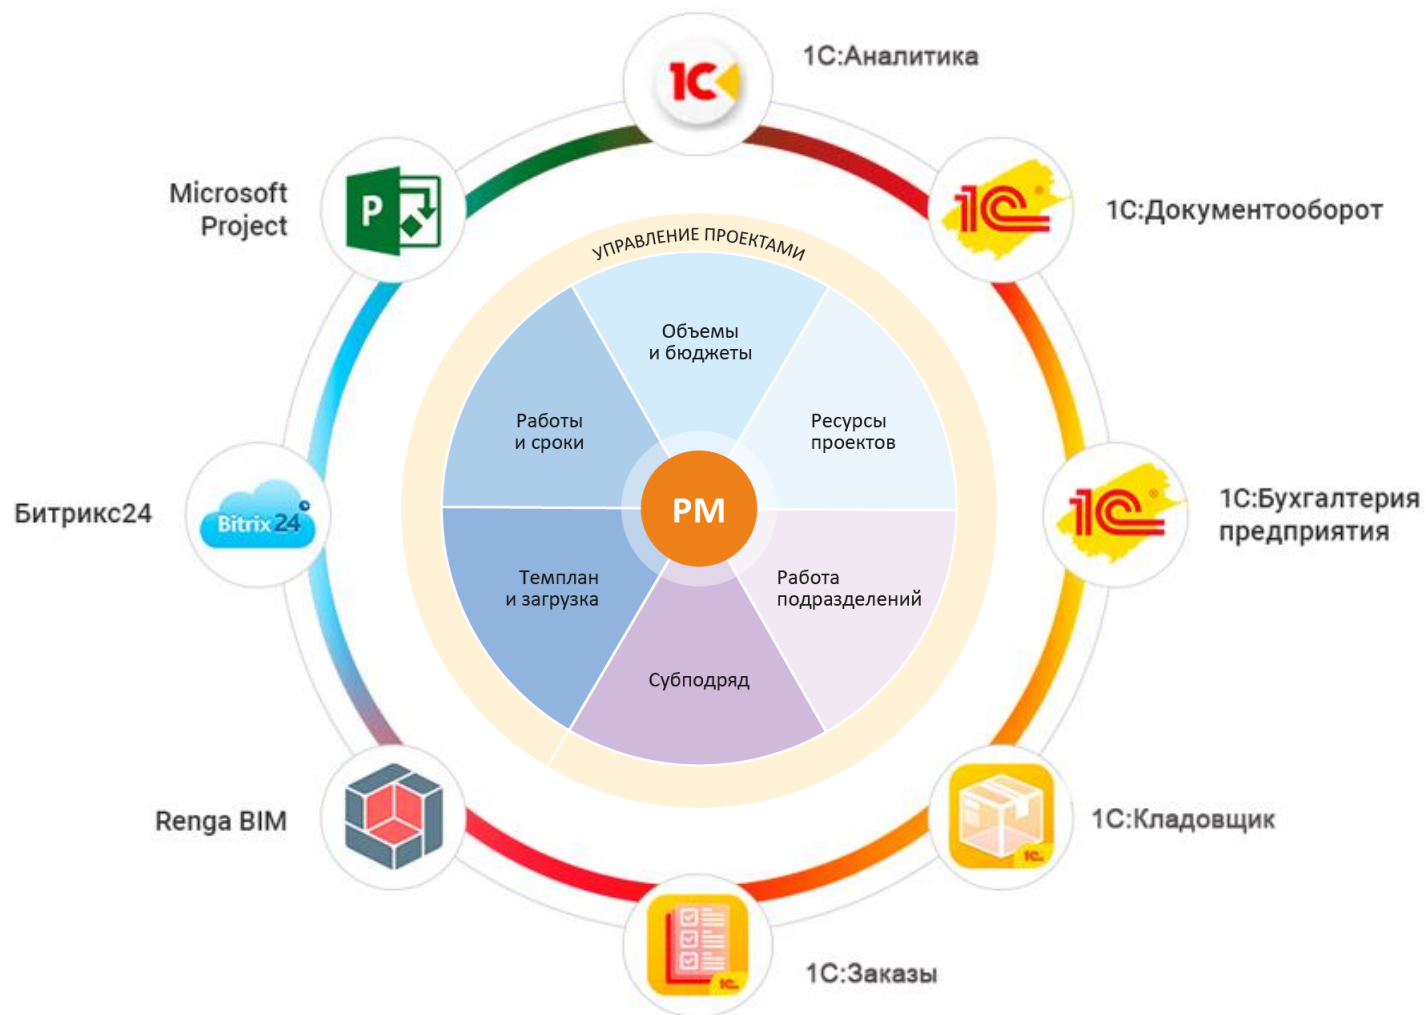

Интеграция с Битрикс24

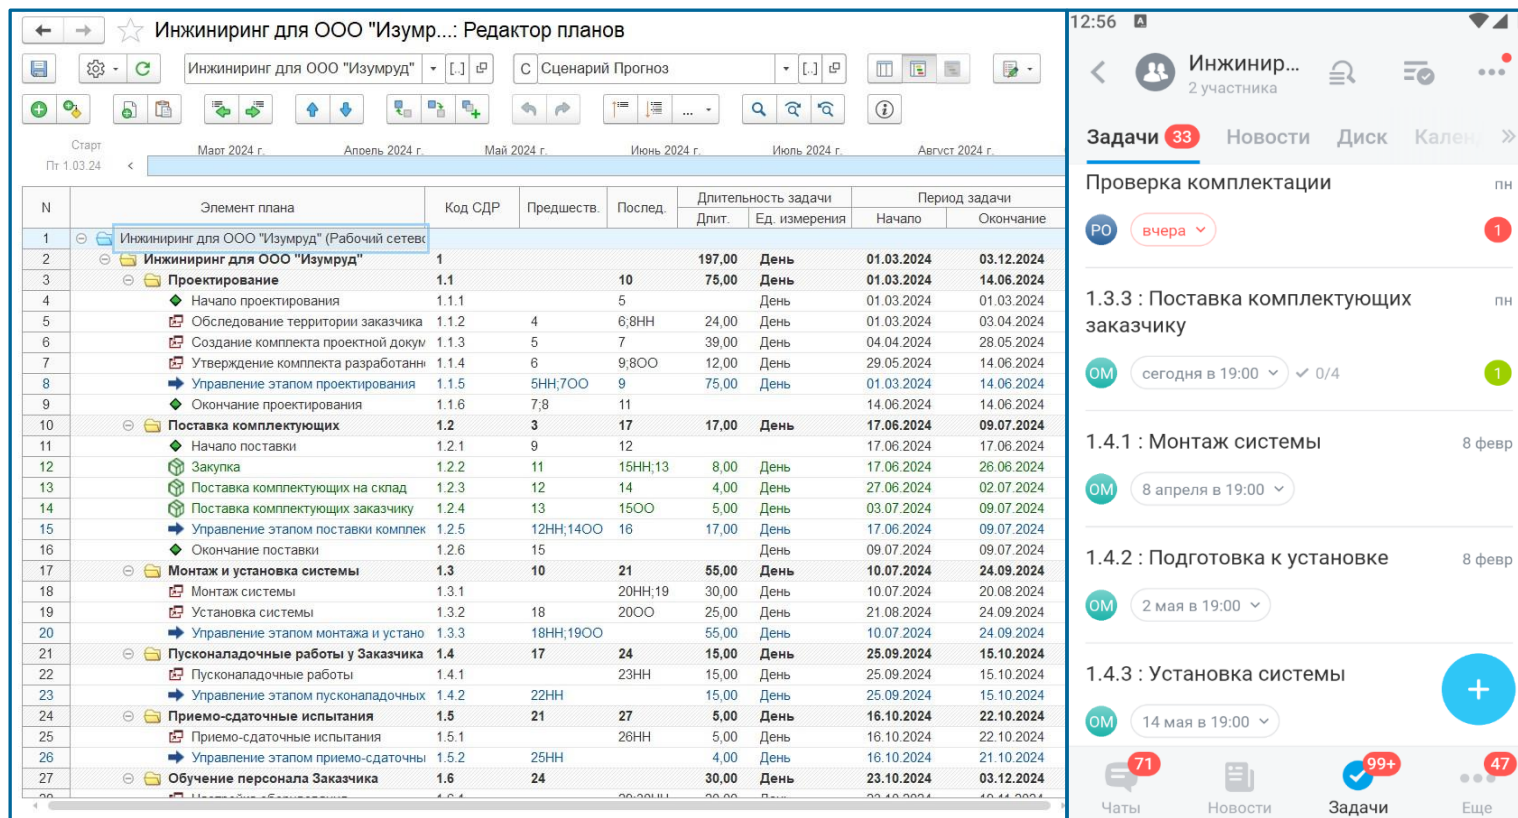

Инжиниринг для ООО "Изумруд": Редактор планов

Инжиниринг для ООО "Изумруд" | Сценарий Прогноз

Старт: Пн 1.03.24

N	Элемент плана	Код СДР	Предшеств.	Послед.	Длительность задачи		Период задачи	
					Длит.	Ед. измерения	Начало	Окончание
1	Инжиниринг для ООО "Изумруд" (Рабочий сетев)							
2	Инжиниринг для ООО "Изумруд"	1		10	197,00	День	01.03.2024	03.12.2024
3	Проектирование	1.1			75,00	День	01.03.2024	14.06.2024
4	Начало проектирования	1.1.1		5		День	01.03.2024	01.03.2024
5	Обследование территории заказчика	1.1.2	4	6,8НН	24,00	День	01.03.2024	03.04.2024
6	Создание комплекта проектной докум	1.1.3	5	7	39,00	День	04.04.2024	28.05.2024
7	Утверждение комплекта разработани	1.1.4	6	9,8ОО	12,00	День	29.05.2024	14.06.2024
8	Управление этапом проектирования	1.1.5	5НН,7ОО	9	75,00	День	01.03.2024	14.06.2024
9	Окончание проектирования	1.1.6	7,8	11		День	14.06.2024	14.06.2024
10	Поставка комплектующих	1.2	3	17	17,00	День	17.06.2024	09.07.2024
11	Начало поставки	1.2.1	9	12		День	17.06.2024	17.06.2024
12	Закупка	1.2.2	11	15НН,13	8,00	День	17.06.2024	26.06.2024
13	Поставка комплектующих на склад	1.2.3	12	14	4,00	День	27.06.2024	02.07.2024
14	Поставка комплектующих заказчику	1.2.4	13	15ОО	5,00	День	03.07.2024	09.07.2024
15	Управление этапом поставки комплек	1.2.5	12НН,14ОО	16	17,00	День	17.06.2024	09.07.2024
16	Окончание поставки	1.2.6	15			День	09.07.2024	09.07.2024
17	Монтаж и установка системы	1.3	10	21	55,00	День	10.07.2024	24.09.2024
18	Монтаж системы	1.3.1		20НН,19	30,00	День	10.07.2024	20.08.2024
19	Установка системы	1.3.2	18	20ОО	25,00	День	21.08.2024	24.09.2024
20	Управление этапом монтажа и устано	1.3.3	18НН,19ОО		55,00	День	10.07.2024	24.09.2024
21	Пусконаладочные работы у Заказчика	1.4	17	24	15,00	День	25.09.2024	15.10.2024
22	Пусконаладочные работы	1.4.1		23НН	15,00	День	25.09.2024	15.10.2024
23	Управление этапом пусконаладочных	1.4.2	22НН		15,00	День	25.09.2024	15.10.2024
24	Приемо-сдаточные испытания	1.5	21	27	5,00	День	16.10.2024	22.10.2024
25	Приемо-сдаточные испытания	1.5.1		26НН	5,00	День	16.10.2024	22.10.2024
26	Управление этапом приемо-сдаточны	1.5.2	25НН		4,00	День	16.10.2024	21.10.2024
27	Обучение персонала Заказчика	1.6	24		30,00	День	23.10.2024	03.12.2024

Инжинир...
2 участника

Задачи 33 **Новости** **Диск** **Кален** >>

Проверка комплектации пн

РД вчера 1

1.3.3 : Поставка комплектующих заказчику пн

ОМ сегодня в 19:00 0/4 1

1.4.1 : Монтаж системы 8 февр

ОМ 8 апреля в 19:00

1.4.2 : Подготовка к установке 8 февр

ОМ 2 мая в 19:00


1.4.3 : Установка системы

ОМ 14 мая в 19:00

Чаты 71 **Задачи** 99+ **Еще** 47

- Общение членов команды проекта и внешних пользователей, включая подрядчиков и заказчиков
- Возможность работать с мобильных устройств
- Передача в Битрикс24 структуры плана проекта и передача из Битрикс24 в 1С:PM факта часов, статуса задач и новых заданий

Интеграция с Битрикс24

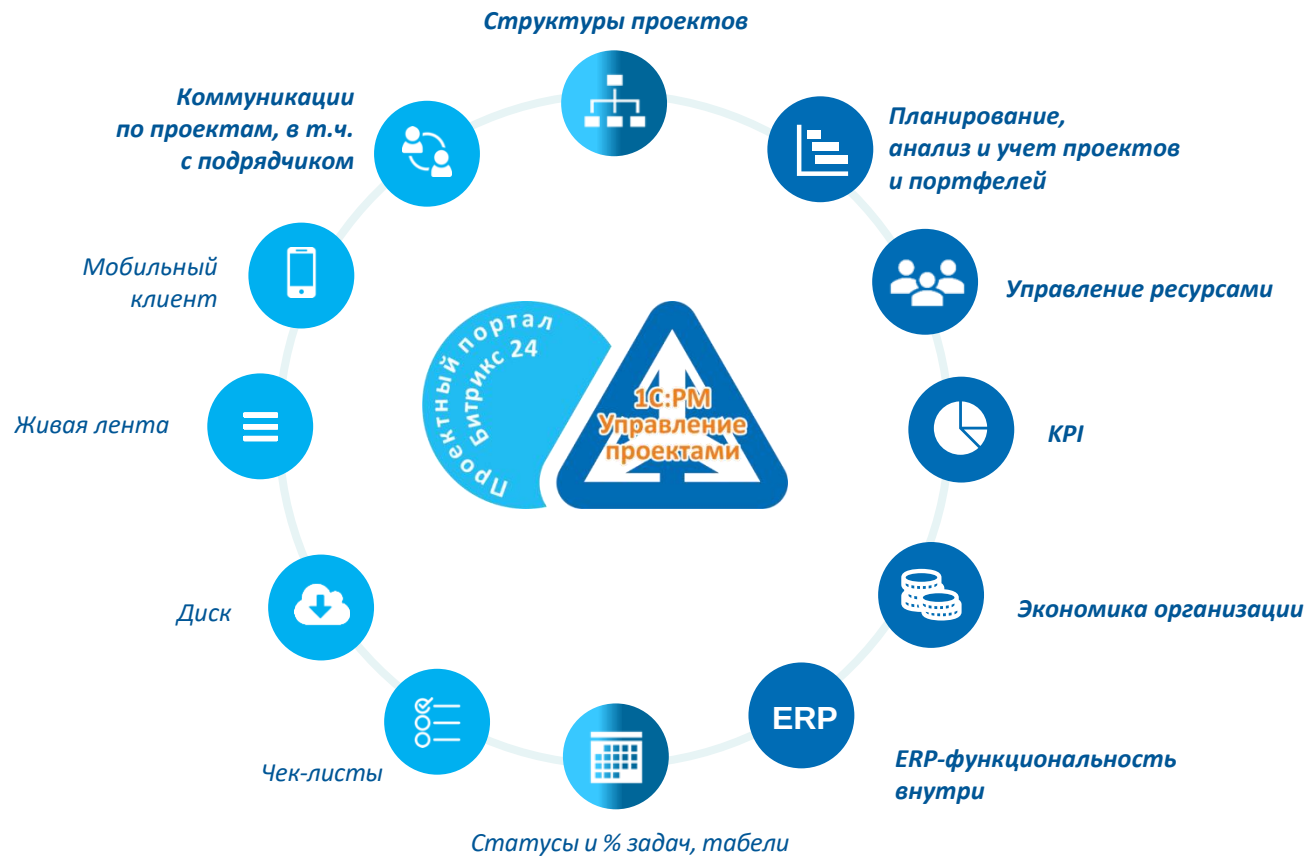


Загрузка 3D-моделей зданий

- отображение 3D-моделей зданий в окне программы
- сопоставление элементов модели с работами проекта

BIM-плеер

- отображение на 3D-модели динамики готовности объектов модели с выделением объектов, по которым ведутся работы на основании сроков выполнения и взаимосвязей строительных работ проекта

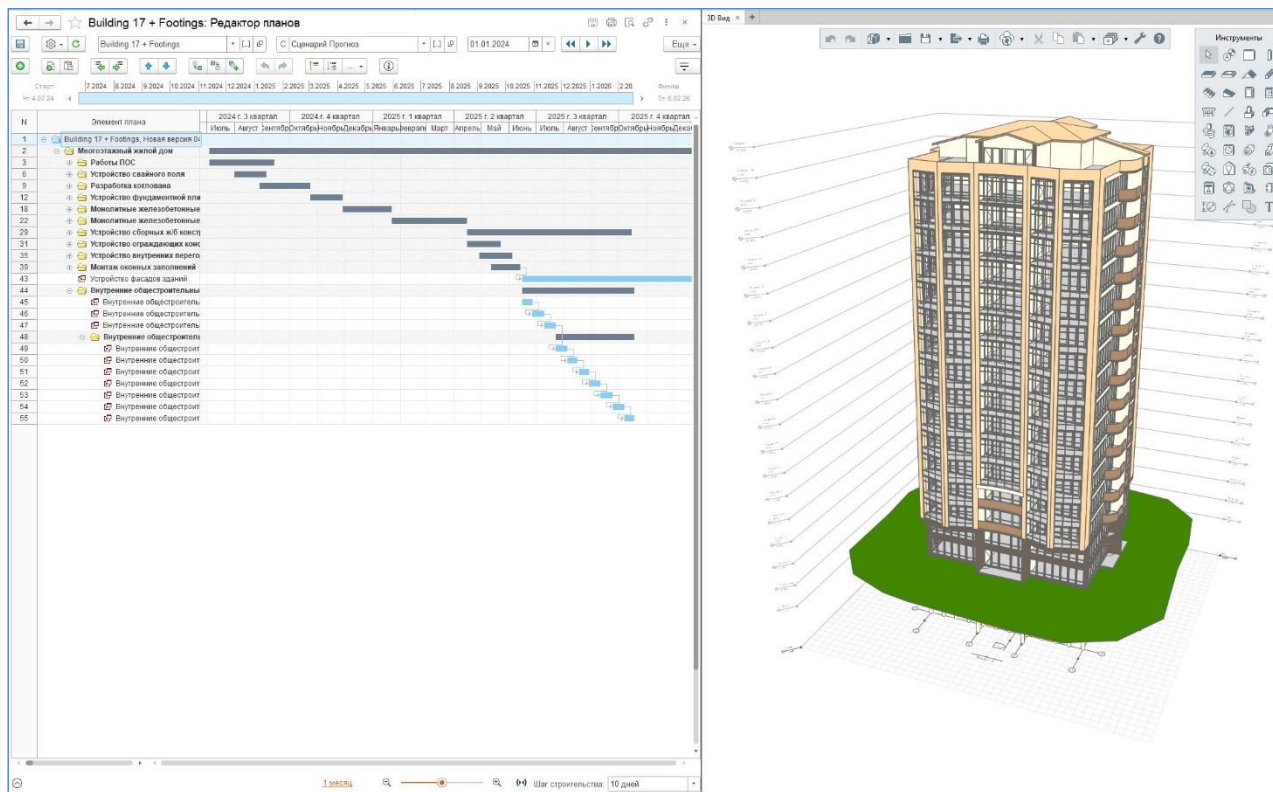



Интеграция с 1С:Смета

Интеграция позволяет загружать в систему данные из файлов формата *.arg в календарно-ресурсный план проекта

Доступна возможность как дополнить план данными, так и полностью заменить структуру проекта данными из файлов

Интеграция с 1С:Аналитика

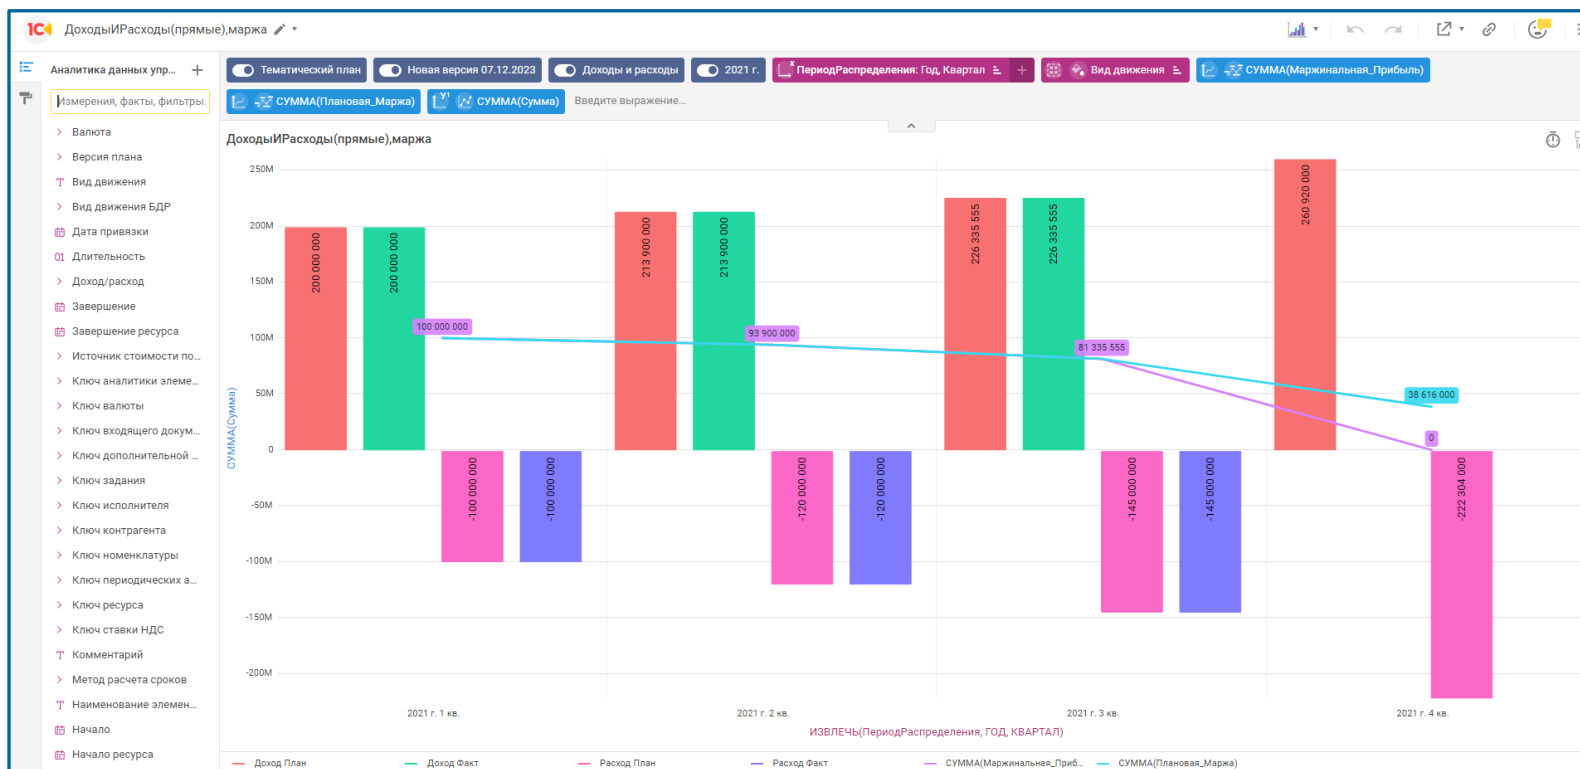



Диаграмма «Доходы и Расходы (прямые), маржа»

Интеграция позволяет осуществлять анализ данных 1С:PM в витрине BI-системы «1С:Аналитика»



Достигаемые эффекты

Достигаемые эффекты



Повышение управляемости
проектной организации



Структурирование
проектной деятельности



Получение согласованных
и всегда актуальных данных
по состоянию проектов
и обеспеченности ресурсами



Контроль соблюдения сроков
проектов и прямой
себестоимости по контракту



Организация равномерной
загрузки проектного
производства



Увеличение объемов
и выработки проектной
организации



Повышение рентабельности
и денежного потока
по проектам



Повышение эффективности
портфелей инвестиционных
и инновационных проектов



Экспертные вебинары



Экспертные вебинары по 5-й редакции 1С:PM Управление проектами

Составление плана проекта
и формирование
ресурсных планов




Формирование БДР и БДДС
проекта на основании объемов
и ресурсного плана



Актуальные данные проектов:
контроль выполнения и прогноз



Выдающихся Вам результатов в работе с проектами!



Фирма «1С»

solutions@1c.ru

<https://solutions.1c.ru/catalog/pm-prof>



ITLand

(495) 644-9136, (812) 448-1255

info@ITLand.ru

www.ITLand.ru

